

Tytuł projektu
STACJA TRANSFORMATOROWA TYPU STLmb-3,6
Projekt adaptacyjny

Nr projektu:

**PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/
 /xxx/KKKT/12/21**



Elektromontaż-Lublin
Spółka z o.o.

20-447 Lublin ul. Diamentowa 1

Autorzy Projektu

Branża	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Pieczętka, podpis
Budowlana:	mgr inż. Jacek Dejne	Upr. bud. 1004/Lb/89	<i>mgr inż. Jacek Dejne</i> upr. bud. 914/Lb/89 upr. proj. 1004/Lb/89
Elektryczna:	mgr inż. Zbigniew Czopik	Upr. bud. 3/Lb/96	<i>mgr inż. elektryk Zbigniew Czopik</i> Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec. SIECI INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTROENERGETYCZNE Nr ewid. 3/Lb/96

INWESTOR:	PGE Dystrybucja S.A.		
INWESTYCJA:			
ADRES INWESTYCJI:			
	<i>Projektanci adaptujący projekt</i>		
branża	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpisy:
BUDOWLANA:			
ELEKTRYCZNA:			

Spis zawartości:

1. Dokumenty formalne
2. Opis techniczny
3. Część rysunkowa

Lublin, grudzień 2021

**UWAGI ORAZ DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZENIA
DOKUMENTACJI:**

ELEKTROMONTAŻ – Lublin Sp. z o. o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Projekt adaptacyjny
STACJI TRANSFORMATOROWEJ TYPU STLmb-3,6

UWAGI / UZGODNIENIA

Prawa autorskie zastrzeżone!
Kopiowanie dozwolone za zgodą jednostki autorskiej.

ADAPTACJA PROJEKTU

- Projekt do adaptacji może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany do konkretnego obiektu budowlanego, przez projektanta tego obiektu po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, albo o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Zaadaptowany projekt do adaptacji łącznie ze sporządzonym przez projektanta obiektu projektem zagospodarowania działki (terenu), stanowić będzie projekt budowlany jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

DOPUSZCZALNE ZMIANY W ADAPTACJI:
<ol style="list-style-type: none">1. Dostosowanie budynku do miejscowych warunków przestrzennych z uwzględnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej obiektów znajdujących się w sąsiedztwie sytuowanej stacji energetycznej.2. Adaptacja systemowego posadowienia budynku stacji STLmb-3,6 zawartego w projekcie do miejscowych warunków gruntowo – wodnych z uwzględnieniem ustalenia w opisie technicznym geotechnicznych warunków posadowienia obiektu budowlanego.3. Inne zmiany dopuszczalne jedynie za zgodą autorów projektu wielokrotnego zastosowania.
WYTYCZNE ADAPTACJI BUDYNKU:
<ol style="list-style-type: none">1. Wykonać należy projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowania.
<ol style="list-style-type: none">2. Zmiany adaptacyjne należy nanosić trwałą techniką, kolorem czerwonym.
<ol style="list-style-type: none">3. W celu uzyskania pozwolenia na budowę projekt wymaga adaptacji przez projektantów z uprawnieniami budowlanymi.

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

Strona tytułowa.....	Strona: 1
Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzenia dokumentacji	Strona: 2
Adaptacja projektu.....	Strona: 3
Zawartość dokumentacji.....	Strona: 4
Część budowlana: 1. Opis techniczny	Strona: 5-9
2. Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo	Strona: 9-10
Część elektryczna: 3. Opis techniczny	Strona: 10-16
4. Uwagi końcowe	Strona: 16
Część rysunkowa: 5. Rysunki budowlane: Rys. nr B1 Elewacja frontowa stacji Rys. nr B2 Elewacja tylna stacji Rys. nr B3 Elewacje boczne stacji Rys. nr B4 Zestawienie drzwi Rys. nr B5 Fundament stacji Rys. nr B6 Posadowienie stacji 6. Rysunki elektryczne: Rys. nr E1 Schemat elektryczny stacji Rys. nr E2 Widok z góry – rozmieszczenie urządzeń Rys. nr E3 Widok z góry – plan instal. ośw. i gniazd wtyk. Rys. nr E4 Rozdzielnica SN typu Xiria-xGear Rys. nr E5 Rozdzielnica nN typu RNL Rys. nr E6 Schemat układu pomiarowego Rys. nr E7 Instalacja uziemiająca stacji Rys. nr E8 Widok podłączenia kabli nN i SN Rys. nr E9 Uszczelnienie doprowadzeń kablowych Rys. nr E10 Obwody wtórne rozdzielnic SN. Pole 1. Rys. nr E11 Obwody wtórne rozdzielnic SN. Pole 2. Rys. nr E12 Obwody wtórne rozdzielnic SN. Pole 3. Rys. nr E13 Obwody wtórne rozdzielnic SN. Pole 4.	

CZEŚĆ BUDOWLANA

1 Opis techniczny

1.1 Zastosowanie stacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 15,75/0,42kV z transformatorem o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany, złożona z elementów żelbetowych. Stacja wykonana jest z trzema ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. Stacja transformatorowa typu STLmb-3,6, jest przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablo-owo-napowietrzną średniego napięcia oraz siecią kablo-owo niskiego napięcia. Służy do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności publicznej i przemysłowych, a w szczególności do zasilania:

- osiedli mieszkaniowych w miastach,
- parków i terenów rekreacyjnych,
- osiedli podmiejskich i wsi,
- placów budów,
- zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

1.2 Podstawa opracowania i aktualnie ważne normy

Stacja spełnia wymagania następujących norm:

1. PN-EN 62271-1: 2018-02. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne.
2. PN-EN 62271 – 200:2012, PN-EN 62271 – 200:2012/AC1:2015-08. Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200. Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe powyżej 1kV do 52 kV włącznie.
3. PN-EN 61439-1:2011. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne.
4. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

1.3 Oznaczenie stacji

Stacja została oznaczona za pomocą symboli literowych.

Znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

- STL – Stacja Transformatorowa Lubelska z wewnętrznym korytarzem obsługi;
mb – miejska betonowa;
3,6 – długość obudowy w metrach.

1.4 Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie stacji bezpośrednio na podłożu gruntowym może być zastosowane pod warunkiem, że we wszystkich rodzaju gruntach niespoistych i niewysadzinowych (piaski żwiry) o stopniu zagęszczenia $I_D \geq 0,7$ zalegających min. $0,8 \div 1,4$ m w zależności od strefy przemarzania gruntu. W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopień plastyczności I_L powinien być $I_L \leq 0,4$. Pod całą powierzchnią fundamentu należy wymienić grunt na piasek gruby o stopniu zagęszczenia $I_D \geq 0,7$ na głębokość zależną od strefy przemarzania tj. max 1,4m.

W przypadku występowania innych gruntów niż podane wyżej należy wykonać indywidualny projekt posadowienia.

1.5 Posadowienie

Pierwszym etapem posadowienia stacji jest wykonanie w ziemi wykopu zgodnego z rysunkiem B6. Ponieważ wprowadzenie kabli do stacji jest możliwe ze wszystkich czterech stron, przy wyznaczaniu długości i szerokości wykopu należy wziąć pod uwagę miejsce wprowadzenia kabli. Od strony przyłącza kablowego ściana wykopu powinna być oddalona od ściany fundamentu stacji o ~ 1 m, a od pozostałych o $\sim 0,4$ m. W wykonanym wykopie należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć go z zaciskami znajdującymi na zewnątrz fundamentu.

Pod fundamentem należy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową o grubości około 200 mm. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby powierzchnia podsypki była wypoziomowana i zagęszczona. Na tak przygotowane miejsce należy ustawić misę fundamentową stacji, następnie ustawić bryłę główną stacji. Po ustawieniu stacji i wprowadzeniu do stacji kabli wykop wypełnić piaskiem zagęszczając go warstwami co 20cm.

UWAGA! Wymagana jest indywidualna analiza konstrukcyjna w przypadkach:

- odmiennych od wyżej wymienionych,
- posadowieniu obiektu na skarpach lub w ich pobliżu,
- jeżeli obok projektuje się wykopy,
- na uszkodach górniczych,
- w gruntach nawadnianych.

Wymagana jest ponadto każdorazowa adaptacja projektu do niniejszych warunków przez osoby uprawnione.

1.6 Budowa stacji

Stacja jest modułową prefabrykowaną konstrukcją składającą się z następujących elementów:

- obudowa betonowa stacji wraz z komorą transformatora i dachem betonowym dwuspadowym o spadku 3°, (istnieje możliwość zamontowania nakładki dachowej),
- fundament betonowy prefabrykowany – piwnica kablowa.

Podłoga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicą SN i nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obsługi stacji znajduje się wjazd do podziemnej części stanowiącej jednocześnie fundament i kanał kablowy. Metalowa część wjazdu jest uziemiona na stałe poprzez przyłączenie go do konstrukcji metalowej w betonie. Pod komorą transformatora znajduje się szczelna misa olejowa, którą pomieści całą zawartość oleju transformatora.

Kable SN i nN z zewnątrz wprowadzone są przez otwory przepustowe umieszczone w części fundamentowej. W otwory przygotowane w ścianie bocznej fundamentu wprowadzić przepusty kablowe uszczelniające typu PKL produkcji Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.

Przepusty te wykonywane są z dwóch tarcz metalowych, okrągłych z otworami przez które przechodzi kabel. Między tarczami znajduje się wkład gumowy uszczelniający.

Tarcze metalowe skręcane na obwodzie śrubami powodują ściśnięcie gumy a tym samym uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu względem ścianek betonu.

Uszczelnienie kabli można dokonywać innymi sposobami, ale przepusty kablowe misy fundamentowej stacji powinny posiadać atesty wykonania w technologii zapewniającej szczelność przy ciśnieniu słupa wody minimum 0,4 bara (tj. 4 m słupa wody) wszystkich wprowadzanych kabli. Szczegółowe rozwiązania, przedstawione w części elektrycznej projektu.

Stacja posiada drzwi wejściowe do korytarza obsługi SN i nN oraz do komory transformatora. W drzwiach znajdują się otwory wentylacyjne z żaluzjami zapewniającymi odpowiednie chłodzenie transformatora.

Kubatura	m ³	18,15
Powierzchnia zabudowy	m ²	9,36
Powierzchnia użytkowa	m ²	8,00

Obiekt zgodnie z wymogami technologicznymi zaprojektowano jako kompaktowy. Na podstawie szczegółowego projektu wykonawczego w wykonaniu fabrycznym.

Stacja transformatorowa posiada Certyfikat Zgodności z normą PN-EN 62271-202:2014-12/AC1:2015-07E wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – Certyfikat Zgodności NR 061/2020.

Wymiary gabarytowe stacji

Części nadziemnej	3600 x 2600 x 2540
Części nadziemnej i z nakładką dachową czterospadową (opcja)	3600 x 2600 x 3000
Części nadziemnej i z nakładką dachową dwuspadową (opcja)	3600 x 2600 x 3200

Masa stacji (bez transformatora)

Maksymalna masa wyposażonej stacji (część nadziemna) bez transformatora:	12200 kg
Masa fundamentu	4500 kg
Masa nakładki dachowej czterospadowej (opcja)	ok. 370 kg
Masa nakładki dachowej dwuspadowej (opcja)	ok. 340 kg

Transport obudowy i fundamentu stacji

Stacja transportowana jest w dwóch częściach:

- wyposażona w aparaturę część nadziemna stacji bez transformatora o wymiarach: 3600x2600x2540 mm i masie 12200kg;
- fundament o wymiarach: 3600x2600x800 mm i masie 4500 kg.

Wyposażenie opcjonalne:

- nakładka czterospadowa na dach o wymiarach: 3840x2900x600mm i masie ok 370 kg;
- nakładka dwuspadowa na dach o wymiarach: 4220x2900x800 mm i masie ok. 340 kg.

1.7 Dane technologiczne

- Oświetlenie – energooszczędne,
- Wentylacja grawitacyjna przez żaluzje drzwiowe oraz specjalne szczeliny między dachem a górnymi krawędziami ścian,
- Instalacja uziemiająca.

1.8 Dane technologiczno-materiałowe

- Ściany - beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37, pokryty tynkiem silikatowo - silikonowym, faktura „kamyczkowa” ziarno 1,5 mm i 2 mm, faktura tynku może być zróżnicowana wg rysunku elewacji, farba elewacyjna akrylowa, kolory powłok stosowne do otoczenia.
–trzy ściany o grubości 120 mm, ściana frontowa – 100mm;
- Fundament - beton zbrojony wibrowany klasy minimum C30/37 o grubości ścianki 90 - 130 mm, pokryty na zewnątrz izolacją przeciwwilgociową, posiada dwie wydzielone komory:

- szczelną misę olejową, mogącą pomieścić powyżej 100% zawartości oleju z transformatora,
- przedział kablowy z przepustami kablowymi;
- Dach płaski betonowy pokryty: farba elewacyjna silikonowa;
- Drzwi aluminiowe z żaluzjami jednoskrzydłowe produkcji Elektromontaż – Lublin Sp. z o.o. wyposażone w zamki według wymagań zamawiającego (standardowo zamki typu MasterKey – RS200). Żaluzje drzwiowe wyposażone w filtry przeciwpylowe. Przewidziano również uchwyt do zakładania kłódki. Konstrukcja ościeżnic oraz szkielet drzwi wykonany jest z profili aluminiowych. Poszycie zewnętrzne i wewnętrzne drzwi wykonane jest z blach aluminiowych odpowiednio giętych i montowanych na szkielecie drzwi.
Drzwi z żaluzjami oraz żaluzje pokryte powłoką malarską poliuretanową lub metodą proszkową (kolor dowolny).

2 Usytuowanie stacji w stosunku do innych obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe

2.1 Klasyfikacja pożarowa budynku

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [5], w dziale VI („Bezpieczeństwo pożarowe”) stacje transformatorowe zaliczane są do budynków grupy PM.

Dla stacji typu STLmb-3,6 gęstość obciążenia ogniowego Q_d wynosi:

- dla transformatora olejowego o mocy 630kVA = **1835 MJ/m²**
- dla transformatora żywicznego klasy F1 lub F2 **≤500 MJ/m²**
- klas odporności pożarowej budynku bez ścian oddzielenia p.poż. = C

Elementy budynku posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia:

- trzy ściany o grubości 120 mm – ściany oddzielenia przeciwpożarowego o odporności ogniowej REI 120,
- ściana frontowa o grubości 100 mm – nie jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego,
- dach – REI 60.

Trzy ściany oddzielenia przeciwpożarowego o grubości 120mm wykonane w klasie REI120, ściana frontowa o grubości 100mm wykonana w klasie odporności ogniowej REI90 i płyta dachowa o odporności ogniowej REI60 (dotyczy elementów żelbetowych). Wszystkie elementy konstrukcyjne stacji wykonane są z materiałów niepalnych spełniających warunek dla elementów nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

2.2 Lokalizacja stacji

Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach budowlanych, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, a także w przepisach odrębnych w tym higieniczno-sanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.

CZEŚĆ ELEKTRYCZNA

3 Opis techniczny

3.1 Wstęp

Stacja STLmb-3,6 z korytarzem obsługi 15,75kV/0,42kV z transformatorem do 630 kVA zbudowana jako budynek –monolit.

3.2 Dane znamionowe stacji

Moc znamionowa stacji max. 630 kVA
Częstotliwość..... 50 Hz
Liczba faz 3

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY SN

Napięcie znamionowe 24 kV
Poziom znamionowy izolacji:
Doziemnej i międzybiegunowej 125 kV / 50 kV
Prąd znamionowy ciągły :
Szyn zbiorczych i pól liniowych 630A
Pola transformatorowego 200A,
Prąd znamionowy 1-sek. szyn zbiorczych i pól liniowych..... 16kA
Prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych..... 40kA
Stopień ochrony – od strony obsługi IP31

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE DLA STRONY NN

Napięcie znamionowe	420 V
Napięcie znamionowe izolacji	690 V
Prąd znamionowy ciągły :	
Szyn zbiorczych i pola transformatorowego.....	1250A,
Pól odpływowych	400A,
Pól agregatowych	910A,
Prąd znamionowy 1-sek. obwodu głównego	20 kA,
Prąd znamionowy szczytowy obwodu głównego	40 kA,
Stopień ochrony – od strony obsługi	IP2X

TRANSFORMATOR

Typ transformatora	olejowy, hermetyczny
Moc transformatora.....	kVA

STOPIEŃ OCHRONY

Stopień ochrony	IP43
-----------------------	------

KLASA OBUDOWY

Klasa obudowy	10
---------------------	----

ŁUKOOCHRONNOŚĆ

Stacja posiada klasę odporności na łuk wewnętrzny	IAC-AB-16 kA-1s
---	-----------------

3.3 Wyposażenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji transformatorowej typu STLmb-3,6 wyposażonej w:

- rozdzielnicę SN typu Xiria-xGear 24kV, 630A, 16kA;
- rozdzielnicę nN typu RNL 400/230V, 1250A, 20kA;
- rezerwa miejsca na szafkę telemechaniki;
- stanowisko transformatorowe.

3.4 Rozdzielnice średniego napięcia typu Xiria-xGear

Rozdzielnica jest przystosowana do pracy w sieciach SN do 24kV. Zespół aparatów i szyn jest zamknięty w hermetycznej obudowie wypełnionej powietrzem o zapewnionej szczelności przez cały czas użytkowania. Rozdzielnica wykonywana jest jako 4-polowa, wyposażona w 3 pola liniowe

z rozłącznikiem 630A z napędami silnikowymi 24V DC zintegrowanym z uziemnikiem i pole transformatorowe z wyłącznikiem 200A z napędem silnikowym 24V DC.

Rozdzielnica o gabarytach 1305 x 1460 x 600 mm (wys. x szer. x gł.).

Konfiguracja pól rozdzielnic pokazana jest na rysunku E4.

Czynności łączeniowe

Osoby wykonujące czynności łączeniowe powinny mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w obsłudze aparatury wysokiego napięcia. Przy przestawianiu rozłącznika lub uziemnika należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, oraz następujących warunków:

- rozłącznik można zamknąć tylko gdy uziemnik jest otwarty
- uziemnik można zamknąć tylko wtedy gdy rozłącznik jest otwarty i uziemiany obwód jest odłączony od napięcia.

Przed dokonaniem (zamknięcia lub otwarcia) rozłącznika lub jego uziemnika należy upewnić się czy zamknięcie lub otwarcie jest dopuszczalne uwzględniając warunki wskazane wyżej.

Połączenie rozdzielnic z transformatorem wykonano kablem 3xYHAKXS (1x70 mm²).

W polu transformatorowym zastosowano głowice K200LR, na transformatorze zastosowano głowice kablowe firmy 24MONOI1.C16-95.CW.

3.5 Rozdzielnica niskiego napięcia typu RNL

Konstrukcja rozdzielnic nN wykonana jest z elementów systemu przystosowanych do połączeń poprzez skręcanie. Rozdzielnica nN składa się z pola zasilającego, pól odpływowych, pól agregatowych, przedziału potrzeb własnych oraz przedziału pomiarowego. Pole zasilające wyposażone jest w rozłącznik główny typu RA-1250. Pole agregatu zaopatrzone w rozłącznik bezpiecznikowy NSL-910A ze zworami prądowymi przystosowany do podpięcia agregatu wyposażonego w wyłącznik główny. Pola odpływowe wyposażone są w rozłączniki bezpiecznikowe typu NSL-400A. Konstrukcja umożliwia wymianę rozłącznika od przodu rozdzielnic. Wprowadzenie kabli do przedziału agregatowego odbywa się przez otwór zlokalizowany na ścianie frontowej stacji transformatorowej.

Wymiary rozdzielnic wynoszą:

- | | |
|---------------|---------|
| - szerokość - | 1574 mm |
| - wysokość - | 1950 mm |
| - głębokość - | 250 mm |

Rozdzielnica jest wyposażona w:

- stacjonarny rozłącznik główny typu RA-1250 firmy Apator,
- sześć pól odpływowych z rozłącznikami bezpiecznikowymi NSL E³ 400A ESU firmy Efen,
- cztery miejsca rezerwowe,
- dwa pola agregatowe z rozłącznikami bezpiecznikowymi wyposażonymi w zwory prądowe typu NSL E³ 910A firmy Efen.

Połączenie rozdzielnic nN z transformatorem (strona nN) wykonano kablem:

L1, L2, L3, N (4 x 2x YKXS 1x240 mm²).

Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w układzie TN-C.

3.6 Szafka pomiarowa

Szafka pomiarowa jest zintegrowana z rozdzielnicą niskiego napięcia. Pomiar realizowany jest po stronie niskiego napięcia (półpośredni). Układ wyposażony jest w przekładniki prądowe znajdujące się pomiędzy rozłącznikiem agregatowym a rozłącznikami odpływowymi. Obwody wtórne prądowe oraz bezpośrednie obwody napięciowe doprowadzone są do licznika za pośrednictwem listwy pomiarowej WAGO. Schemat układu pomiarowego znajduje się na rysunku E6, natomiast rozmieszczenie urządzeń w układzie pomiarowym na rysunku E5.

3.7 Komora transformatora

W stacji przewiduje się montaż transformatora w wykonaniu fabrycznym bez dodatkowych elementów o mocy kVA. Stacja transformatorowa jest przystosowana do zainstalowania transformatora o mocy max. 630kVA. Transformator jest wstawiany przez drzwi, po czym zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kół blokadami oraz posadowiony na podkładach antywibracyjnych zapobiegających przenoszeniu się wibracji transformatora na konstrukcję stacji.

Posadzka w komorze transformatorowej posiada otwór, przez który w razie wycieku, olej z transformatora spływa do szczelnej misy olejowej stanowiącej wydzieloną część fundamentu.

3.8 Uziemienie stacji

Stacja posiada uziemienie ochronne i robocze podłączone do wspólnego uziomu na zewnątrz stacji. Główna magistrala uziemiająca wewnątrz stacji składa się z części poziomej wykonanej z płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 40x5 wewnątrz stacji.

W stacji do głównej magistrali (E7) podłączono:

- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Rozdzielnicę nN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Szafę telemechaniki w jednym punkcie - przewód LgY 25 mm²;
- Każdą transformatora – przewód LgY 35 mm²;
- Dach stacji jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie;
- Bryła główna, fundament (kablownia) w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Ościeżnice w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Drzwi w jednym punkcie - przewód LgY 25 mm²;
- Właz - jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie;

- Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Konstrukcja do połączenia żył powrotnych kabli SN - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
- Płozy transformatora - bednarką Fe/Zn 40x5 [mm].

Stacja jest fabrycznie wyposażona we wszystkie połączenia ochronne i uziemiające wewnętrzne. W czasie montażu stacji należy jedynie połączyć stację z fundamentem i na zewnątrz do uziomu otokowego poprzez zaciski uziemiające stacji. Połączenia wyprowadzić przez otwory 2xØ13mm i skrócić dwoma prętami M10.

Optymalny dobór i wykonanie uziemienia stacji SN/nN polega na przyjęciu takiego rozwiązania, które przy minimalnych nakładach materiałowych i finansowych gwarantuje parametry zgodne z obowiązującymi przepisami, a tym samym zachowaniem bezpieczeństwa porażeniowego w stacji SN/nN i sieci nN.

Instalację uziemiającą należy wykonać etapami. Kolejność postępowania:

- a) w oparciu o aktualne przepisy należy określić wymaganą wartość uziemienia stacji;
- b) wokół stacji wykonać uziom otokowy w odległości 1m od zarysu stacji na głębokości 0,8m;
- c) do uziomu otokowego przyłączyć przewody uziemiające uziemienia ochronnego SN oraz przewody ochronne uziemienia roboczego nN wyprowadzone ze stacji;
- d) uziom otokowy należy połączyć z:
 - dostępnym uziomem fundamentowym pobliskiego budynku wykonanym zgodnie z aktualnymi przepisami;
 - dostępną szyną wyrównawczą lub zaciskiem wyrównawczym pobliskiego budynku do którego są przyłączone wszelkie metalowe instalacje i konstrukcje znajdujące się w budynku zgodnie z aktualnymi przepisami. Jeżeli uziom fundamentowy budynku połączony jest z szyną wyrównawczą niema potrzeby prowadzenia dwóch przewodów uziomowych do uziomu otokowego stacji;
- e) po ułożeniu kabli i uziemieniu ich metalowych powłok lub żył powrotnych dokonać pomiaru rezystancji wypadkowej uziemienia stacji przy zastosowaniu metody technicznej małoprądowej. Zwraca się uwagę że w warunkach miejskich o dużym zagęszczeniu uziomów naturalnych, stosowanie metod mostkowych do pomiaru rezystancji uziemienia (np. miernik typu IMU) jest nie właściwe a uzyskane wyniki nie są wiarygodne;
- f) otrzymany wynik pomiarów porównać z wartością wcześniej określoną i w przypadku gdy wartość wcześniej zmierzona będzie większa od wartości dopuszczalnej (co może zaistnieć niezmiernie rzadko) należy podjąć decyzje o przystąpieniu do wykonania uziomów pionowych.

W przypadku braku uzyskania wymaganej rezystancji uziomu należy rozbudować uziom otokowy o uziomy pionowe. Ilość uziomów pionowych należy dobrać w zależności od wyników pomiarów.

Przytoczone rozwiązania stanowią przykłady, które mogą być adoptowane w całości lub częściowo przez projektanta lub wykonawcę stosownie do warunków lokalnych oraz możliwości i ograniczeń technologicznych wykonawcy.

3.9 Ochrona przed przepięciami

Budynek stacji nie będzie chroniony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych. Stacja przewidziana jest do pracy w sieci wyłącznie kablowej i w większości przypadków nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych. Jeżeli jednak kable SN, wychodzące ze stacji powiązane będą z siecią napowietrzną, wtedy należy zastosować wariant rozdzielnic SN z ogranicznikami przepięć.

3.10 Instalacje elektryczne

Oświetlenie pomieszczeń w budynku wykonane jest źródłami energooszczędnymi (plafonierey proste z kloszem 60 W) zamontowanymi w ilości:

- 2 sztuki w korytarzu obsługi jako oświetlenie ruchu elektrycznego

Wyłącznik oświetlenia oraz gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewnętrznej stronie ściany obok drzwi wejściowych do korytarza obsługi. Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych oraz gniazda w stacji zrealizowane jest w postaci wyłączników nadprądowych zainstalowanych w rozdzielnicach nN oraz ogranicznika przepięć I+II. Oprawy oświetleniowe zasilane są przewodami DY 3x1.5 mm² w korytkach.

3.11 Sprzęt ochronny i p. pożarowy

Producent nie wyposaża w sprzęt ochronny BHP stacji. Istnieje możliwość doposażenia stacji w sprzęt ochronny BHP po wcześniejszym uzgodnieniu z Elektromontaż –Lublin Sp. z o. o..

3.12 Obsługa stacji

Obsługa urządzeń rozdzielni średniego i niskiego napięcia odbywać się będzie wewnątrz budynku ze wspólnego korytarza obsługi. Wszystkie łączniki rozdzielnic średniego napięcia wyposażone są w napędy silnikowe, które będą powiązane z telemechaniką po montażu szafki wewnątrz stacji. Wszystkie łączniki niskiego napięcia wyposażone są w napędy ręczne. W drzwiach do komory transformatora zastosowano drewniane barierki ochronne.

3.13 Uszczelnienie przepustów kablowych

Kable przy wprowadzeniu do stacji transformatorowej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, a miejsca wprowadzenia kabli do otworów w fundamencie stacji powinny być uszczelnione. By spełnić te wymagania proponujemy wykorzystanie przepustów tarczowych i rurowych. Rozwiązania oprócz funkcjonalności zapewniają wodoszczelność, odporność na zmienne warunki atmosferyczne, odporność na agresywność chemiczną gruntu.

Przepust typu PKL

/ produkcji Elektromontaż - Lublin Sp. z o.o.

Przepusty te wykonywane są z dwóch tarcz metalowych, okrągłych z otworami przez które przechodzi kabel. Między tarczami znajduje się wkład gumowy uszczelniający. Tarcze metalowe skręcane na obwodzie śrubami powodują ściśnięcie gumy a tym samym uszczelnienie kabla oraz uszczelnienie przepustu względem ścianek betonu.

Rodzaje przepustów:

- Przepusty Φ 170 mm dla kabli SN z trzema otworami,
- Przepusty Φ 125 mm dla kabli nN z jednym otworem.

Wskazane jest aby procesu uszczelniania tzn. skręcania dokonywać wewnątrz fundamentu. W celu prawidłowego montażu przepustu należy dokręcać wszystkie śruby poczynając od środka a dalej po przekątnej sukcesywnie co 1-1/2 obrotu nakrętki, maksymalny moment dokręcania śrub przepustów wynosi 25Nm – bezwzględnie należy użyć klucza dynamometrycznego (w razie potrzeby na gwint śrub nanieść środek zmniejszający tarcie). W celu zamówienia przepustów tarczowych u producenta stacji należy podać typy kabli SN i nN lub ich średnicę zewnętrzną.

Ww. rozwiązania są przedstawione na rysunku nr. E9.

4 Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w Energetyce. Wszelkie uwagi o zachowaniu się stacji kierować na adres producenta.

Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin

ul. Diamentowa 1

tel. (81) 7286 200

fax. (81) 7286 202

<http://www.elektromontaz-lublin.pl>, **e-mail:** sprzedaz@elektromontaz-lublin.pl


UWAGA:
Żaluzje drzwiowe wyposażone
w filtry przeciwpylowe

Dach w wariantach 0 – stropodach
Wariant podstawowy,
dach betonowy malowany,
o kącie nachylenia 3°.

Dostępne inne opcje wykonania dachu:

Dach w wariantach 1 – czterospadowy
Dach kopertowy czterospadowy o nachyleniu 19°,
o konstrukcji metalowej, nakładany na dach betonowy.
Pokrycie: Blachodachówka, blacha trapezowa

Dach w wariantach 2 – dwuspadowy
Dach dwuspadowy o nachyleniu 30°,
o konstrukcji metalowej, nakładany na dach betonowy.
Pokrycie: Blachodachówka, blacha trapezowa

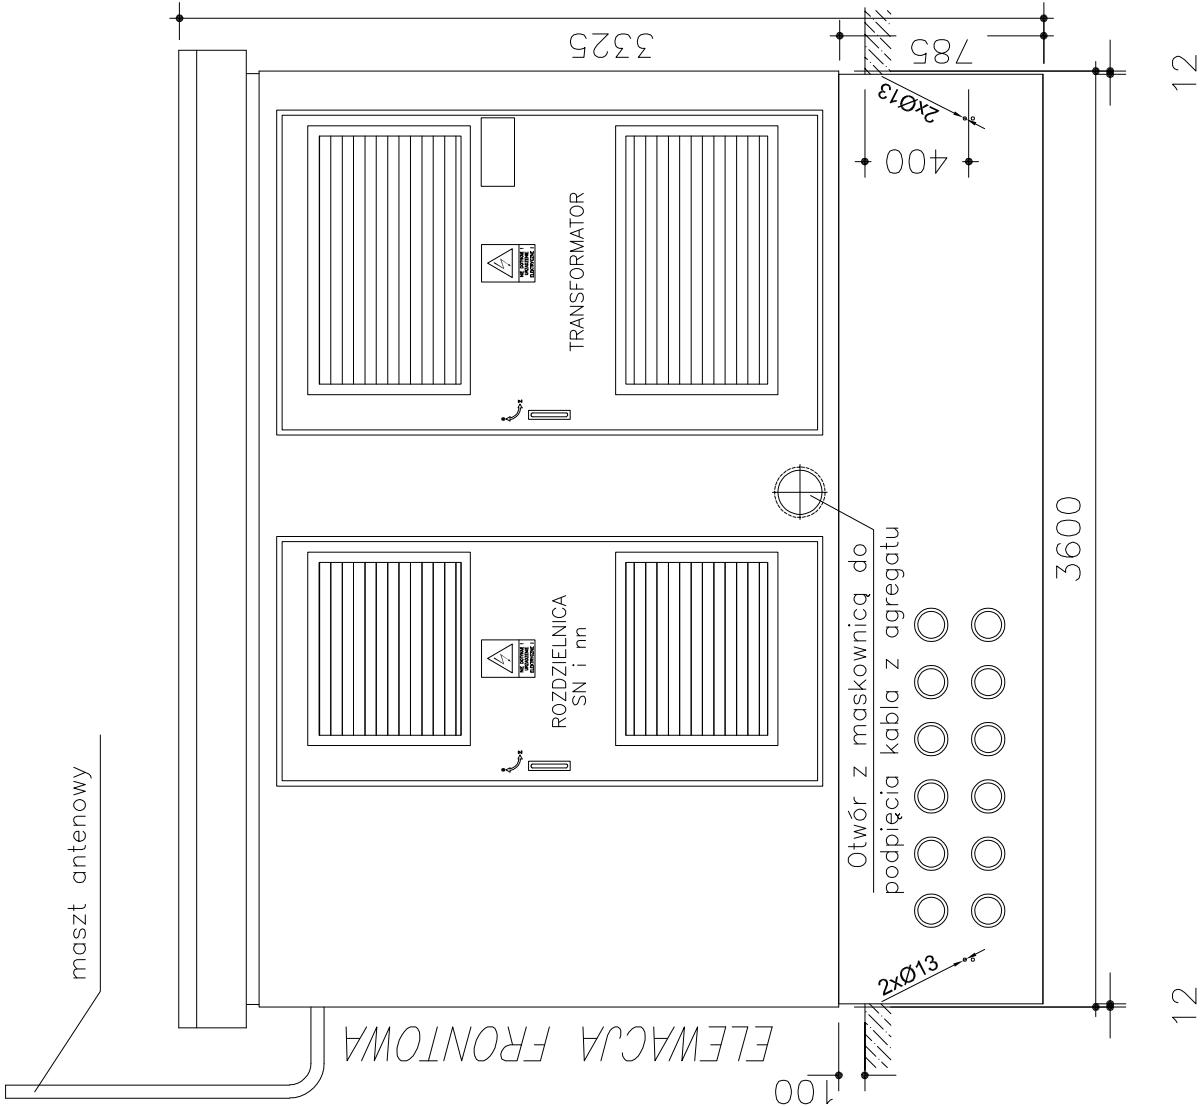

Producent:	Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Dąbrowska 1				Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.		data: 2021.12	
	Projektował:	mgr inż. J. Dejneka	Nr uprawnień:	1004/Lb/89	Lokalizacja:	xxx	skala:	1:
	Opracował:	inż. K. Gajderowicz	–	–	Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21	format:	A4
	Zatwierdził:	–	–	–	Tytuł rysunku:	Elewacja frontowa stacji	arkusz:	1/1
	Adaptował:	–	–	–	Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6			rys. nr B1

Dach w wariancie 0 – stropodach

Wariant podstawowy,
dach betonowy malowany,
o kącie nachylenia 3°.


Dostępne inne opcje wykonania dachu:

Dach w wariancie 1 – czterospadowy

Dach kopertowy czterospadowy o nachyleniu 19°, o konstrukcji metalowej, nakładany na dach betonowy.
Pokrycie: Blachodachówka, blacha trapezowa

Dach w wariancie 2 – dwuspadowy

Dach dwuspadowy o nachyleniu 30°,
o konstrukcji metalowej, nakładany na dach betonowy.
Pokrycie: Blachodachówka, blacha trapezowa

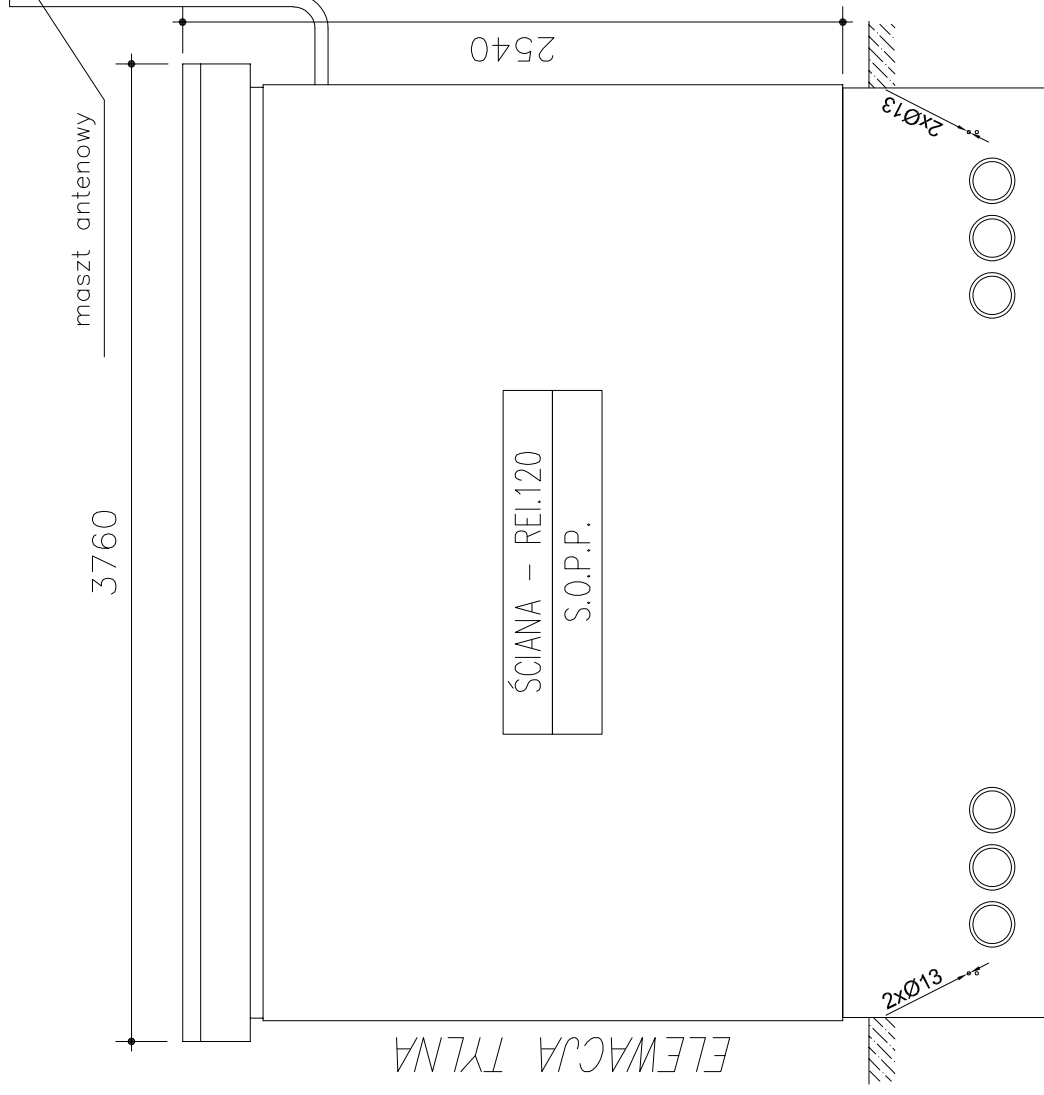

3760

maszt antenowy

2540

ŚCIANA - REL.120

S.O.P.P.

2x073



Producent:



Elektromontgiz

Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Lokalizacja: **xxxx**

Numer oprac.: **PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21**

Tytuł rysunku: Elewacja tylna stacji

Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6


data: 2021.12


skala: 1:

format: A4



arkusz:	1/1
---------	-----

rvs. nr **B2**

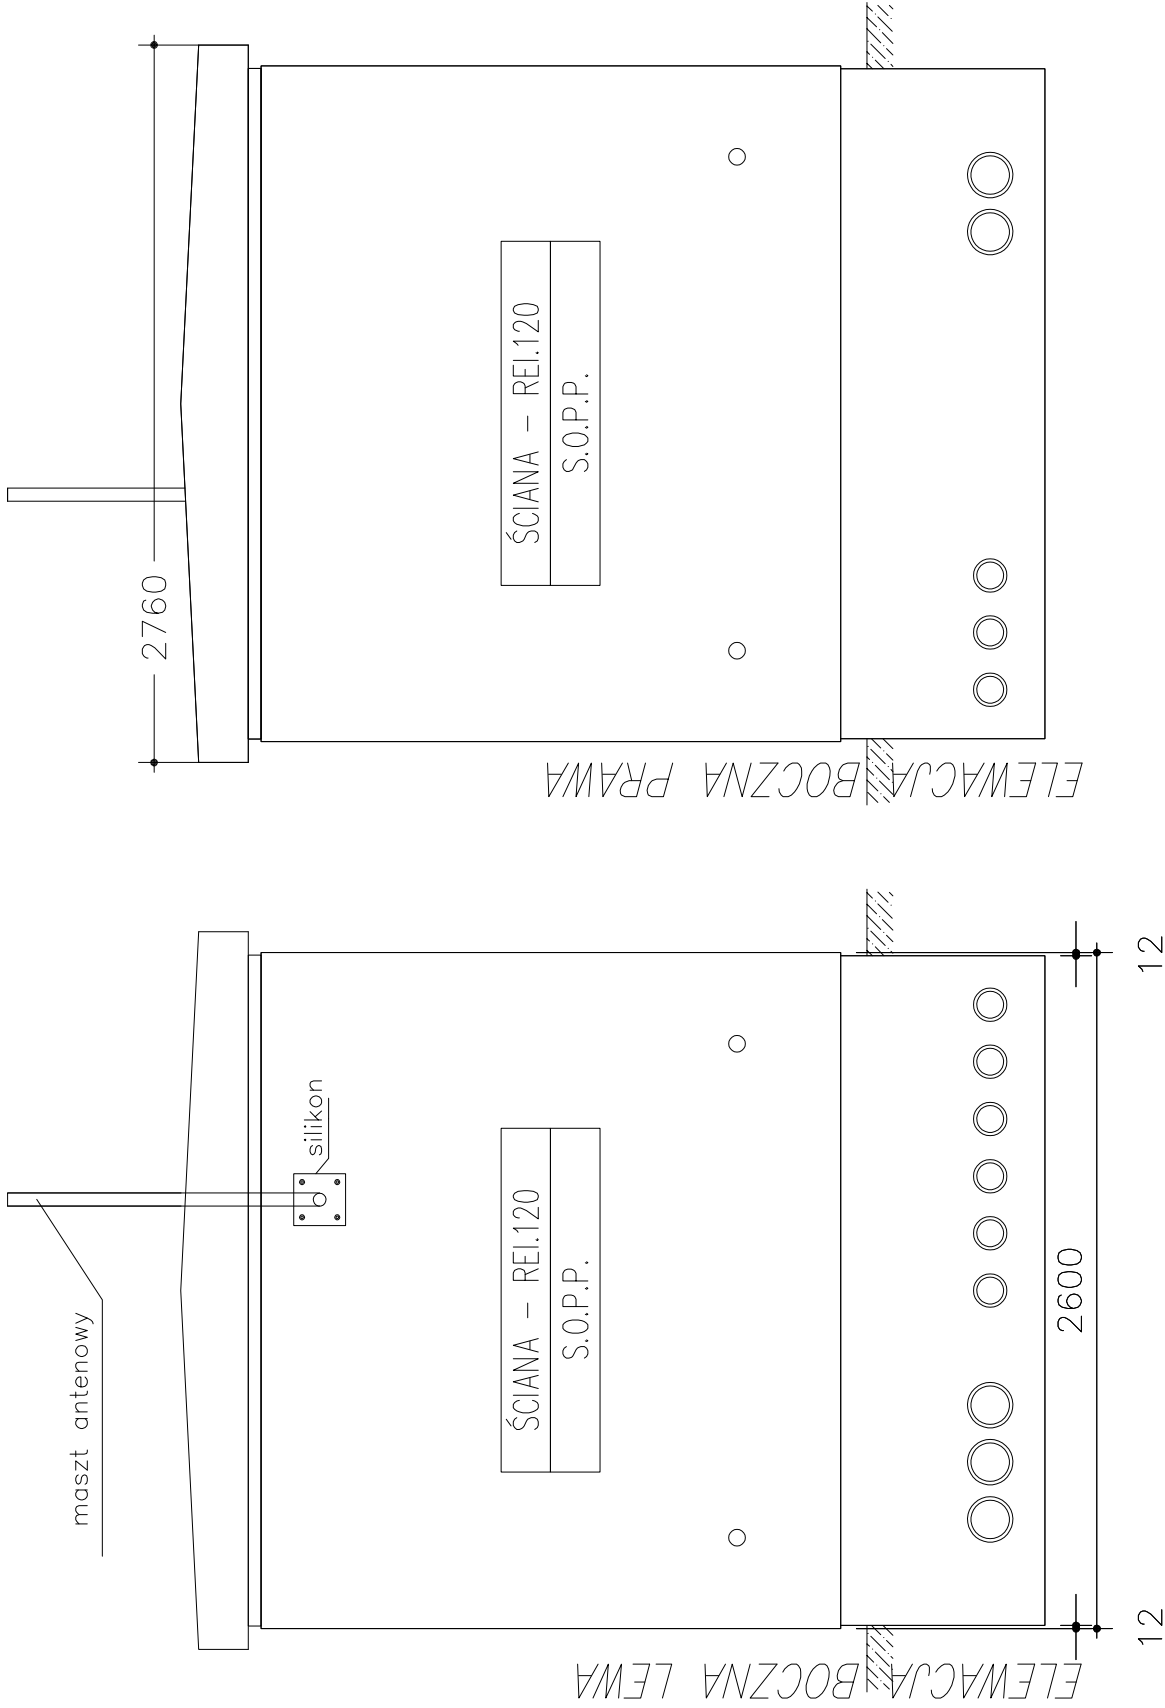

Producent:				Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.			data: 2021.12		
 Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Dąbrowska 1	Projektował:	mgr inż. J. Dejneki		Lokalizacja: xxx		skala: 1:		rys. nr B3	
	Opracował:	inż. K. Gajderowicz		Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21		format: A4			
	Zatwierdził:	—		Tytuł rysunku: Elewacje boczne stacji		arkusz: 1/1			
	Adaptował:	—		Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6					


ZESTAWIENIE DRZWI

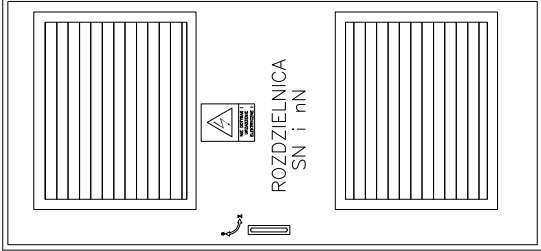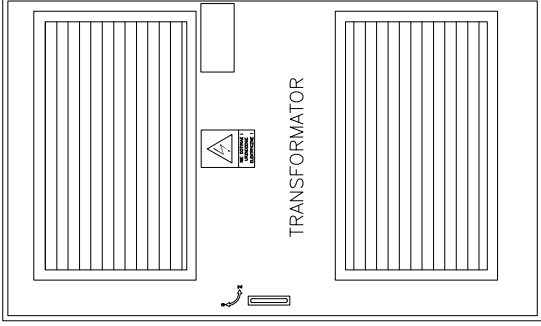Nazwa elementu		Drzwi do budynków energetycznych	
Oznaczn. na rys.		D 1	D 2
SCHEMAT			
Wykonanie		drzwi aluminiowe	drzwi aluminiowe
Żaluzje drzwiowe		drzwi z żaluzjami	drzwi z żaluzjami
Wymiary w świetle ościeży	S _o	880	1170
	H _o	2020	2020
Kierunek otwierania		L	P
Ilość szt		-	1
Ilość ogółem szt		1	1
UWAGI		Żaluzje drzwiowe wyposażone w filtry przeciwpylowe	Żaluzje drzwiowe wyposażone w filtry przeciwpylowe





Producent:		PGE Dystrybucja S.A.		data: 2021.12	
Projektował:	mgr inż. J. Dejneka	Inwestor:		skala:	1:
Opracował:	inż. K. Gajderowicz	Lokalizacja:		format:	A4
Zatwierdził:	—	Numer oprac.:		arkusz:	1/1
Adaptował:	—	Tytuł rysunku:		rys. nr	B4
		Zestawienie drzwi			
		Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6			



20-447 Lublin, ul. Dłamentowa 1

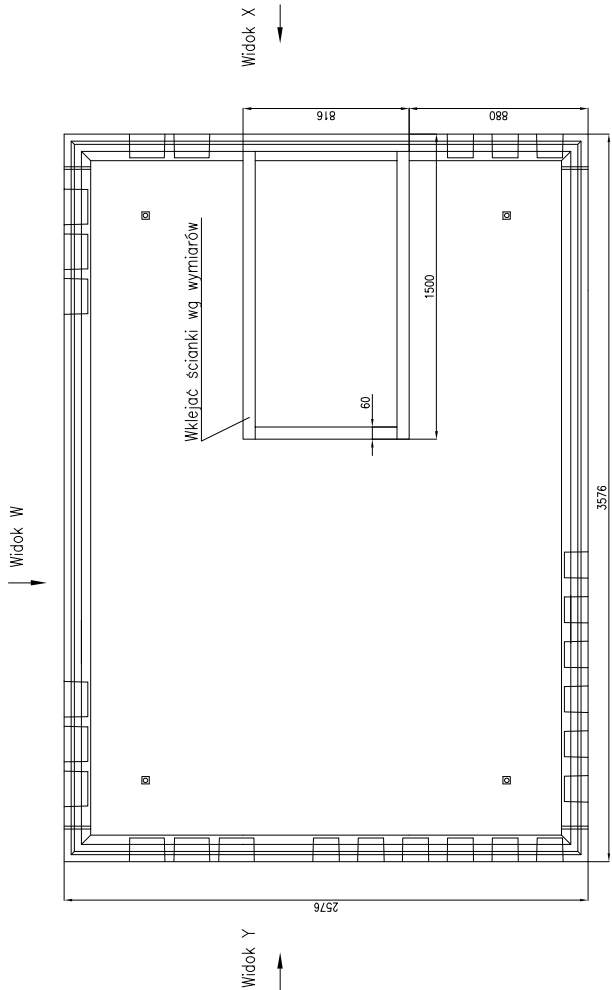

UWAGA!!
Fundament przystosowany do podnoszenia za podłogę
poprzez kotwy RD24 oraz petle transportowe.

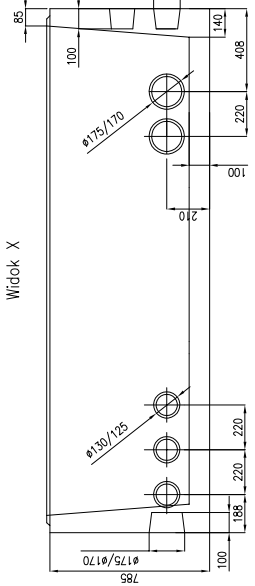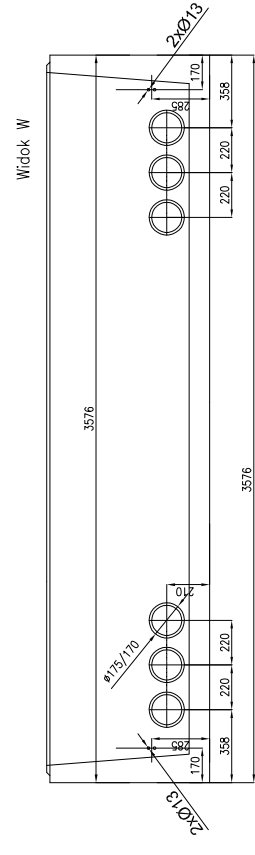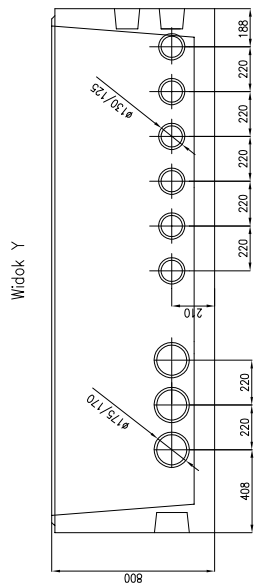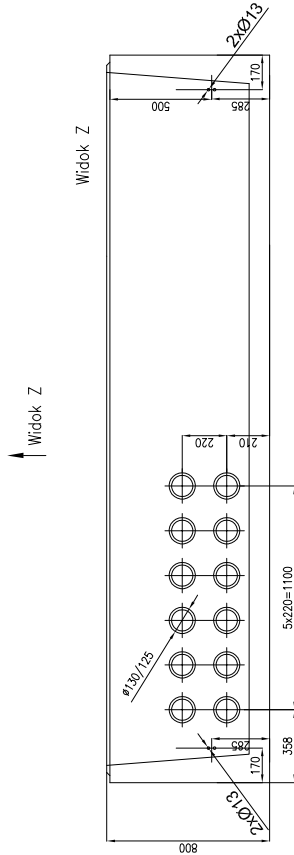

Producent:	Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1				Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.		data: 2021.12	
	Projektował:	mgr inż. J. Dejne	Nr uprawnień:	1004/Lb/89	Lokalizacja:	xxx	skala:	1:
	Opracował:	inż. K. Gajderowicz	—	—	Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21	format:	A4
	Zatwierdził:	—	—	—	Tytuł rysunku:	Fundament stacji	arkusz:	1/1
	Adaptował:	—	—	—	Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6		rys. nr	B5

a). Posadowienie stacji w gruntach niewysadzinowych:

The diagram shows a cross-section of a station foundation. A central rectangular structure is shown with a width of 50 units. It sits on a layer of coarse sand or gravel (PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB ŻWIRU) which has a minimum thickness of 70-140 cm depending on soil conditions. The foundation itself is made of concrete (FUNDAMENT STACJI Z IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ) and has a height of 95 cm. On top of the foundation are two small rectangular structures labeled OPPASKA, each with a width of 50 units. The ground surface slopes away from the center at 1% and 2%. Dimensions for the OPPASKA include a height of 10 units and a base width of 70 units. The total width of the foundation base is 80 units.

OPPASKA

50

1%

2%

FUNDAMENT STACJI Z IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ

PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO LUB ŻWIRU
 $J_D \geq 0,7$

OPPASKA

50

2%

1%

10

70


80

95


70-140


MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO 0,7–1,4m W ZALEŻNOŚCI OD STREFY PRZEMARZANIA GRUNTU

b). Posadowienie stacji w gruntach wysadzinowych:

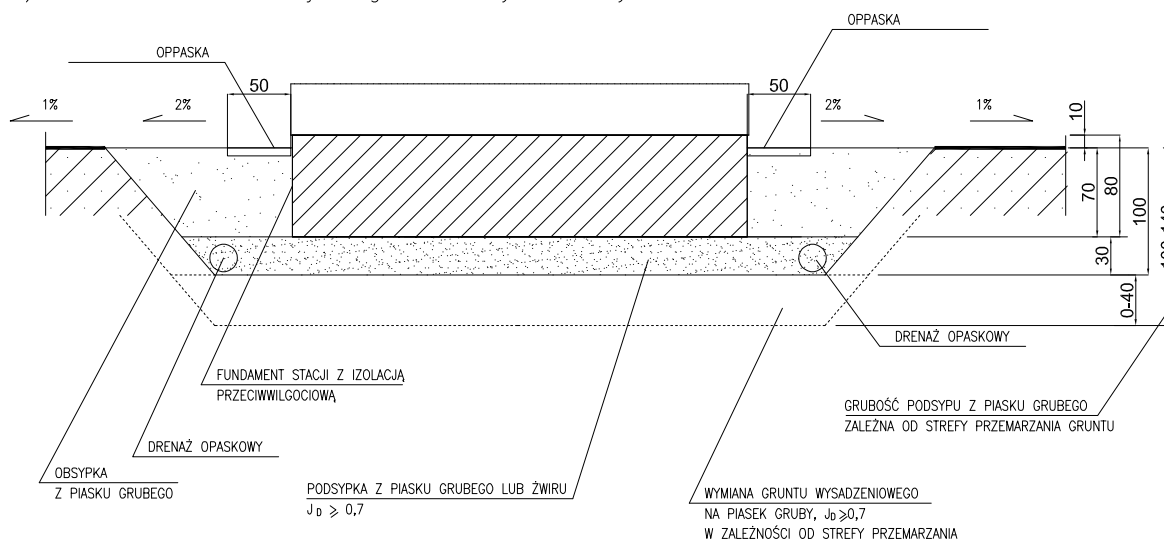

Uwaga: Wymiary w centymetrach.

<div>Producent:</div> <div><div><div>Elektromontaż</div><div>Lublin Sp. z o.o.</div><div>20-447 Lublin, ul. Dąbrowska 1</div></div></div>		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	PGE Dystrybucja S.A.	data: 2021.12
	Projektował:	mgr inż. J. Dejneka	1004/Lb/89		Lokalizacja:	xxx	skala: 1:
	Opracował:	inż. K. Gajderowicz	—		Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21	format: A4
	Zatwierdził:	—	—		Tytuł rysunku:	Posadowienie stacji	arkusz: 1/1
	Adaptował:	—	—			Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6	rys. nr B6

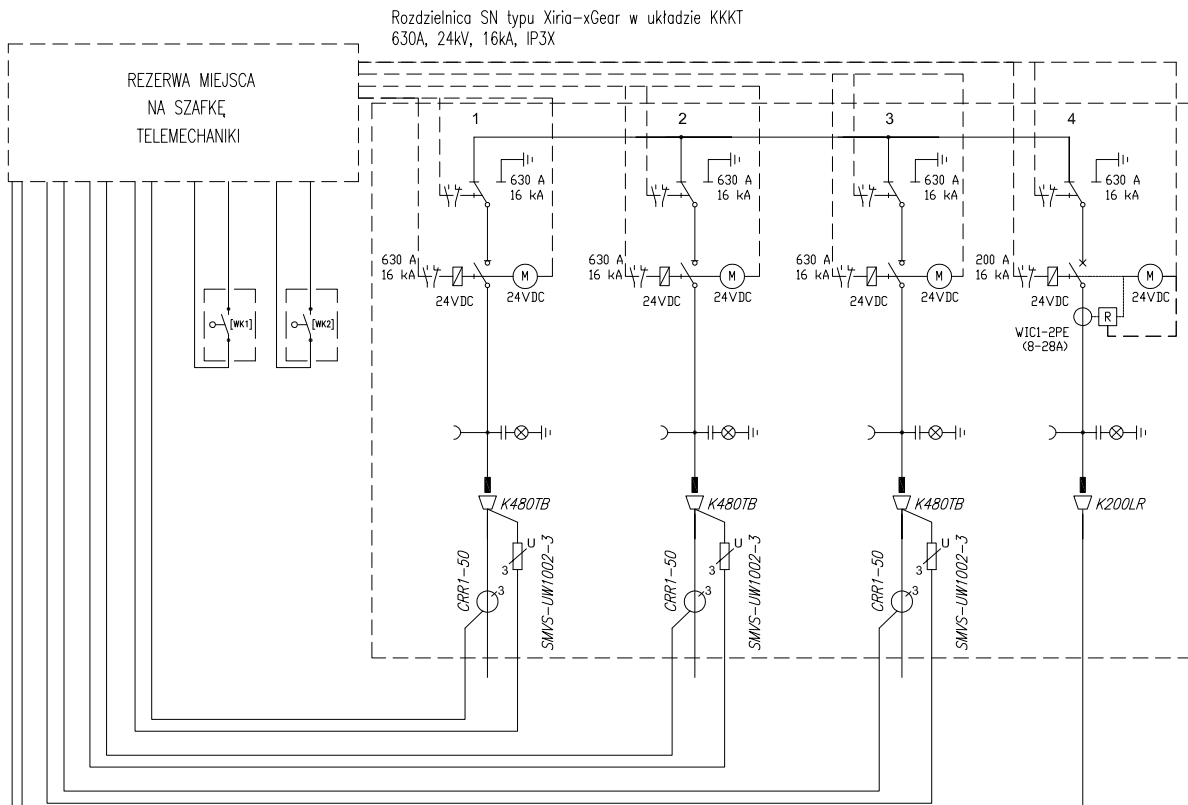

UWAGA:
- OPRZEWODOWANIE ROZDZ. SN – TELEMECHANIKA DO WYKONANIA
NA ETAPIE MONTAŻU SZAFKI TELEMECHANIKI;
- PO MONTAŻU SENSORÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH W ROZDZIELNICY SN,
ZAPASY KABLOWE Z SENSORÓW UMOCOWAĆ NA ŚCIANIE BOCZNEJ ROZDZ. SN.

Dobór przekładników prądowych

Moc transformatora	Przekładnia przekładników prąd.
Do 160kVA	250A/5A FS5 5VA kl.0,2 wzorc.
200kVA – 400kVA	600A/5A FS5 5VA kl.0,2 wzorc.
500kVA – 630kVA	800A/5A FS5 5VA kl.0,2 wzorc.

TRANSFORMATOR

Moc (max.630)	kVA
Nap. górne	15,75	kV
Nap. dolne	0,42	kV
Grupa połączeń	Dyn5	

Kompensacja biegu
jałowego transformatora


1kvar
440V


Rozdzielnica nN typu RNL
1250A; 400/230V; 20/40kA; IP2X

3x(2xYKXs 1x240mm²) (L1,L2,L3)
2xYKXs 1x240mm² (PEN) [0,6/1kV]

2x NSL E³ gr.3 910A
6x NSL E³ gr.2 400A ESF
4x rezerwa miejsca

L1, L2, L3 In=1250A 400/230V 50Hz

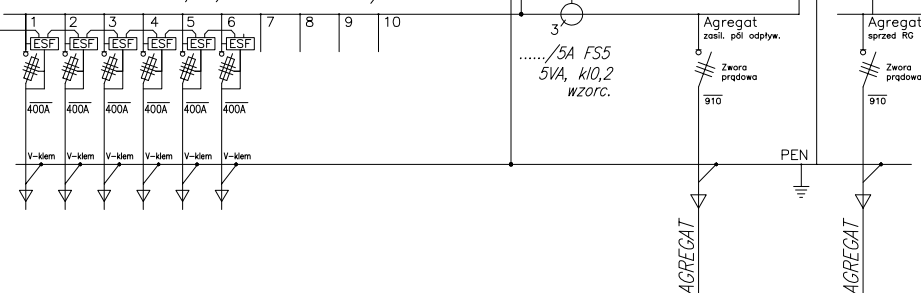


<div>Producent:</div> <div><div>Elektromontaż Lublin Sp. z o.o.</div><div>20-447 Lublin, ul. Damentowa 1</div></div>	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	PGE Dystrybucja S.A.	data: 2021.12
	Projektował:		mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96	Lokalizacja:	xxx	skala: 1:
	Opracował:		inż. K. Gajderowicz	—	Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21	format: A4
	Zatwierdził:		—	—	Tytuł rysunku:	Schemat elektryczny stacji	arkusz: 1/1
	Adaptował:		—	—	Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6		rys. nr E1

Elektromontaż
Lublin Sp. z o.o.




20-447 Lublin, ul. Dłamentowa 1

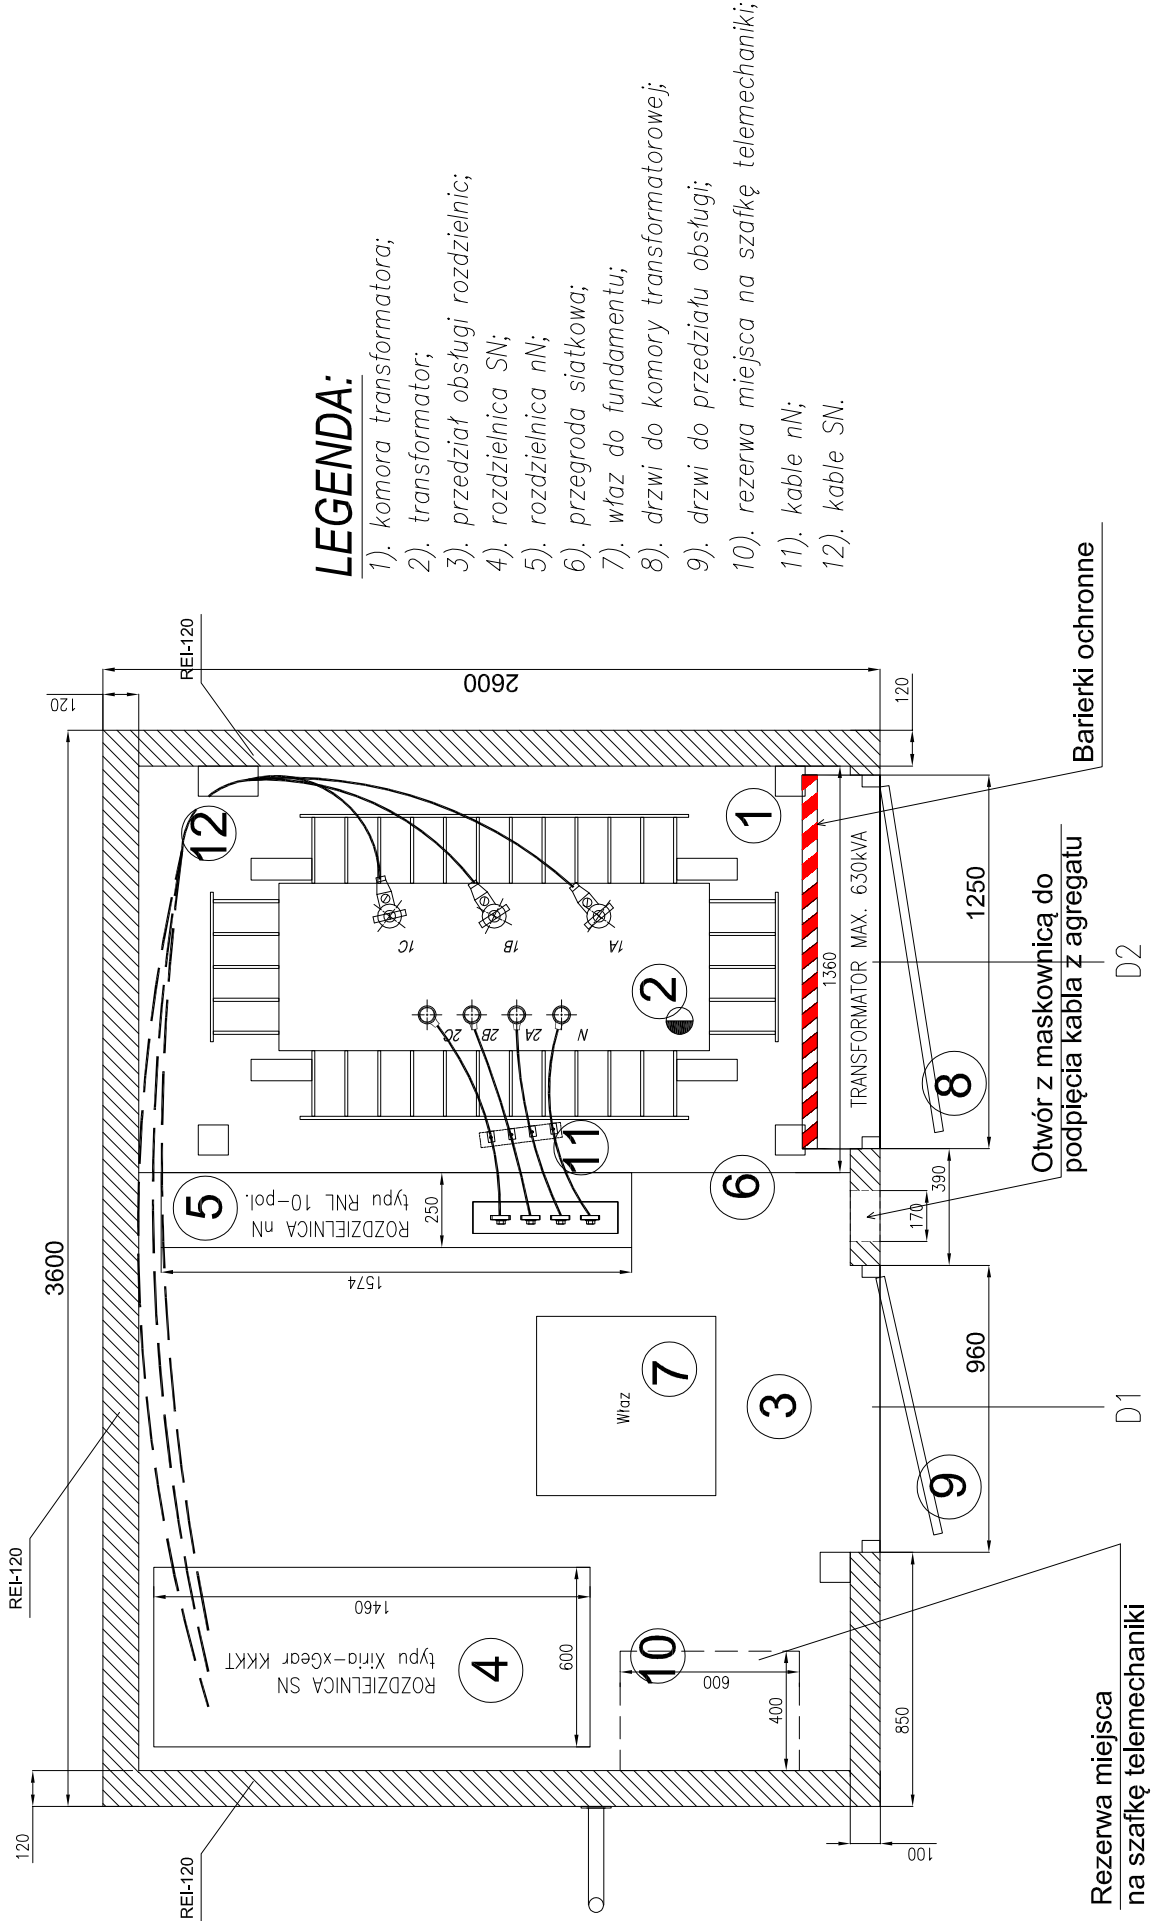

LEGENDA:

- 1). komora transformatora;
- 2). transformator;
- 3). przedział obsługi rozdzielnic;
- 4). rozdzielnica SN;
- 5). rozdzielnica nN;
- 6). przegroda siatkowa;
- 7). właz do fundamentu;
- 8). drzwi do komory transformatorowej;
- 9). drzwi do przedziału obsługi;
- 10). rezerwa miejsca na szafkę telemechaniki;
- 11). kable nN;
- 12). kable SN.

Rezerwa miejsca na szafkę telemechaniki

Producent:		Inwestor:		PGE Dystrybucja S.A.		data: 2021.12	
 Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1	Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:		
	Opracował:	inż. K. Gajderowicz	—		Lokalizacja:	xxx	
	Zatwierdził:	—	—		Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21	
	Adaptował:	—	—		Tytuł rysunku:	Widok z góry - rozmieszczenie urządzeń	
						Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6	
						skala:	1:
						format:	A4
						arkusz:	1/1
						rys. nr	E2

Łącznik krzywkowy


WYBÓR STEROWANIA

- 0 - sterow. odstawione
- 1 - sterow. lokalne
- 2 - sterow. zdalne


Lampka zielona sygnalizująca
gotowość do sterowania
elektrycznego

Xiria-xGear K-K-K-T

Widok z przodu

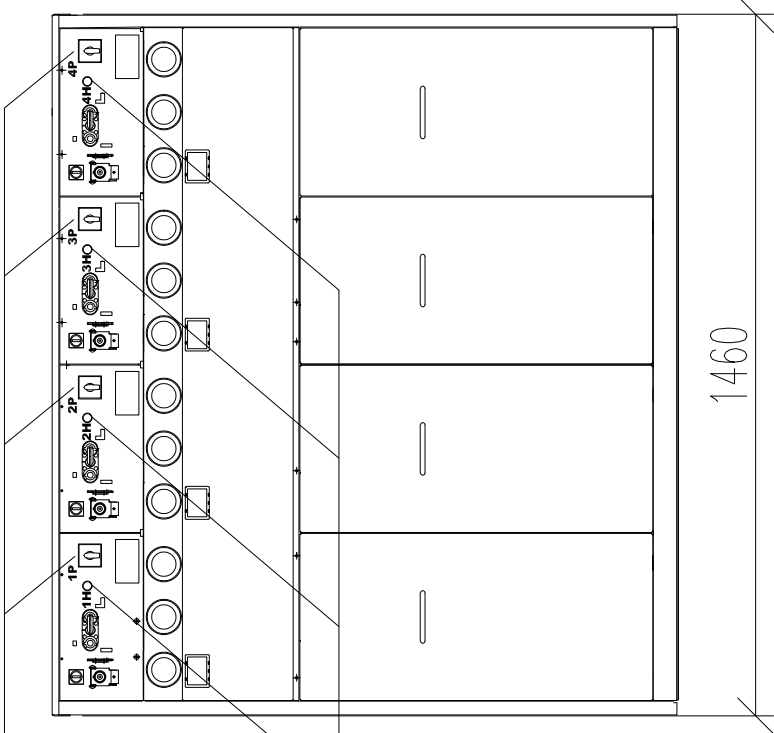


Widok z boku

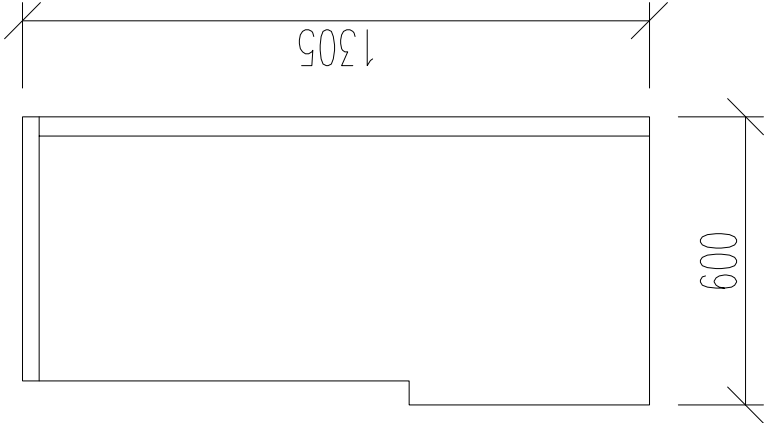

Producent:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień:		Podpis:		Inwestor:		PGE Dystrybucja S.A.		data: 2021.12	
Projektował:		mgr inż. Z. Czopik		3/Lb/96				Lokalizacja:		xxx		skala: 1:	
Opracował:		inż. K. Gajderowicz		-				Numer oprac.:		PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21		format: A4	
Zatwierdził:		--		-				Tytuł rysunku:		Rozdzielnica SN typu Xiria-xGear		arkusz: 1/1	
Adaptował:		--		-						Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6		rys. nr E4	

Płyta montażowa
tworzywowa;
wchylina

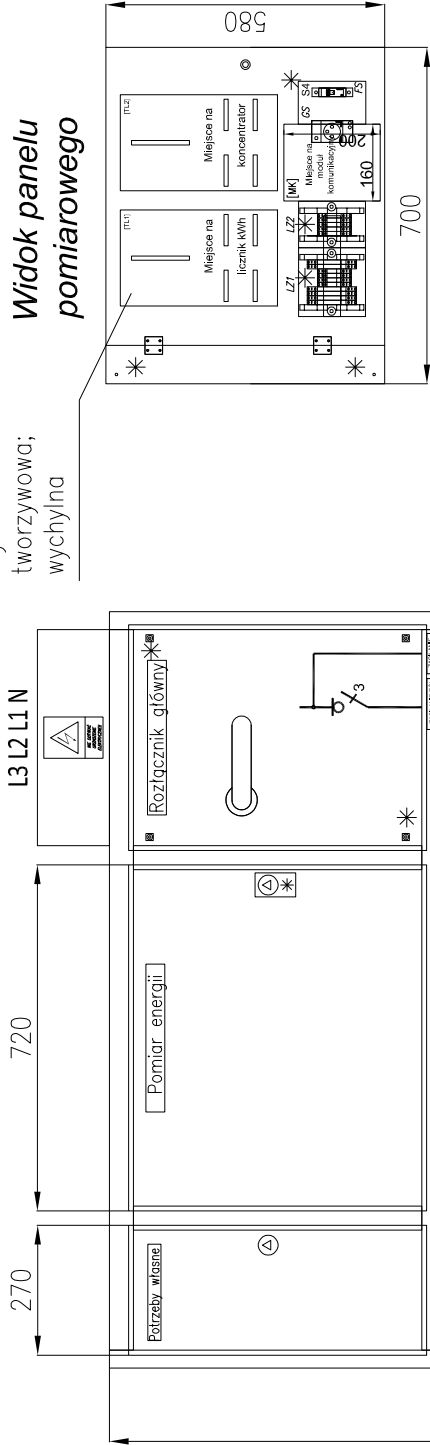

Widok panelu
pomiarowego

Widok przedziału
potrzeb własnych

F1, F1.1, F1.2, F1.3

F1.4, V1.4

UWAGI:

* – przystosowane do plombowania

Producent:	PGE Dystrybucja S.A.				data: 2021.12	
	Lokalizacja: xxx				skala: 1:	
	Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21				format: A4	
	Tytuł rysunku: Rozdzielnica nN typu RNL				arkusz: 1/1	
	Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6				rys. nr E5	

TL 1

* LICZNIK ELEKTRONICZNY

* MODUŁ KOMUNIKACYJNY


obwód prądowy L1 obwody napięciowe obwód prądowy L2 obwód prądowy L3

Zasilanie koncentratora Zasilanie modemu

Zabezpieczenie gniazda Gniazdo serwisowe




LZ1

* WAGO 847-1051/000-2100

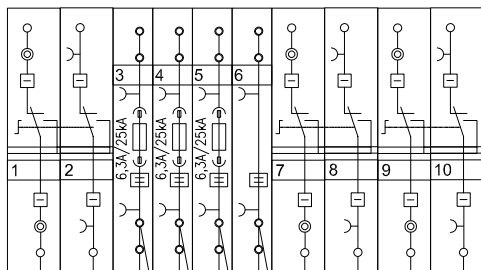

LZ2

* WAGO 847-1054

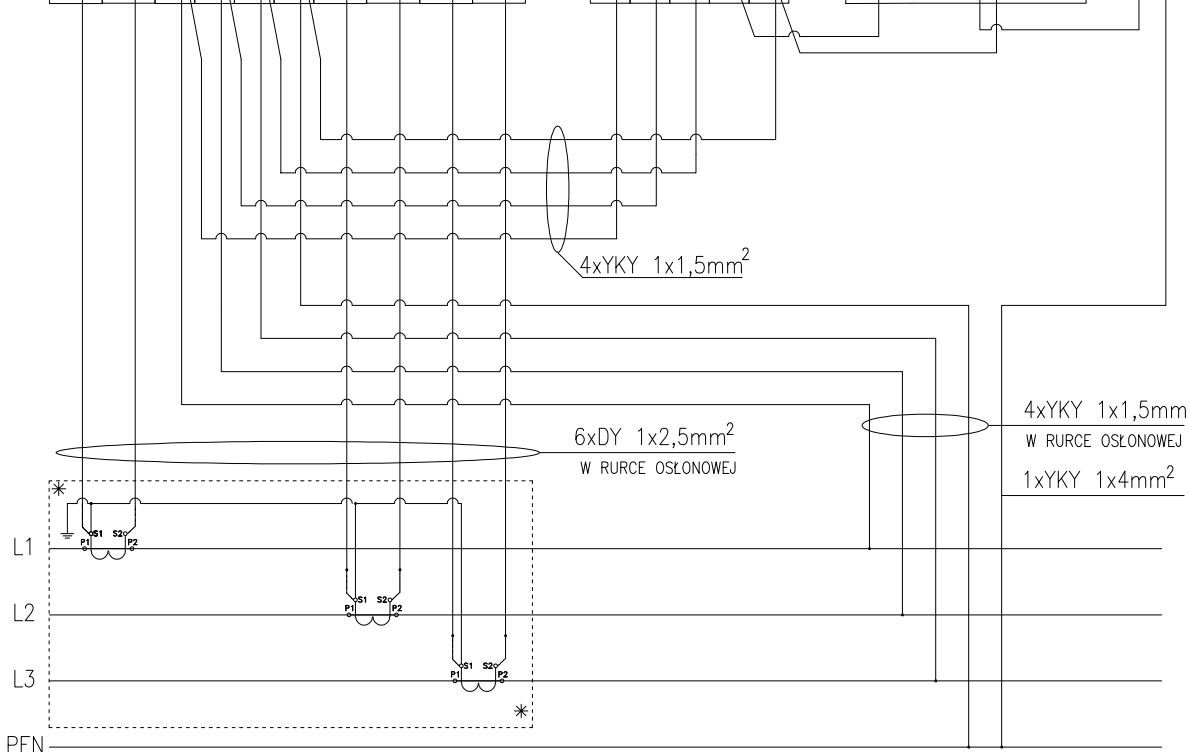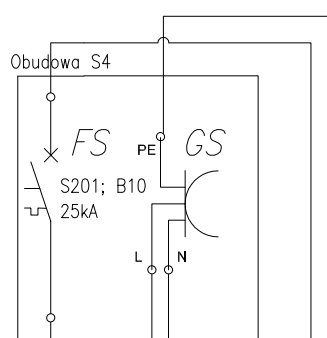

[T1...3]
...../5A FS5
5VA, kl.0,2

UWAGI:

- * – przystosowane do plombowania
- 1. Obwody napięciowe od listwy do licznika przewód YKY 1,5mm²
- 2. Obwody prądowe od listwy do licznika przewód DY 2,5mm²
- 3. PE wykonać kablem YKY 1x4mm²

Dobór przekładników prądowych


Moc transformatora	Przekładnia przekładników prąd.
Do 160kVA	250A/5A FS5 5VA kl.0,2 wzorc.
200kVA – 400kVA	600A/5A FS5 5VA kl.0,2 wzorc.
500kVA – 630kVA	800A/5A FS5 5VA kl.0,2 wzorc.

data:	2021.12
skala:	1:
format:	A4
arkusz:	1/1
rys. nr	E6
Investor:	PGE Dystrybucja S.A.
Lokalizacja:	xxx
Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/121
Tytuł rysunku:	Schemat układu pomiarowego Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6
Podpis:	
Nr uprawnień:	3/Lb/96
Imię i nazwisko:	mgr inż. Z. Czopik
Projektował:	inż. K. Gajderowicz
Opracował:	–
Zatwierdził:	–
Adaptował:	–

Producent:



20-447 Lublin, ul. Dąbrowska 1

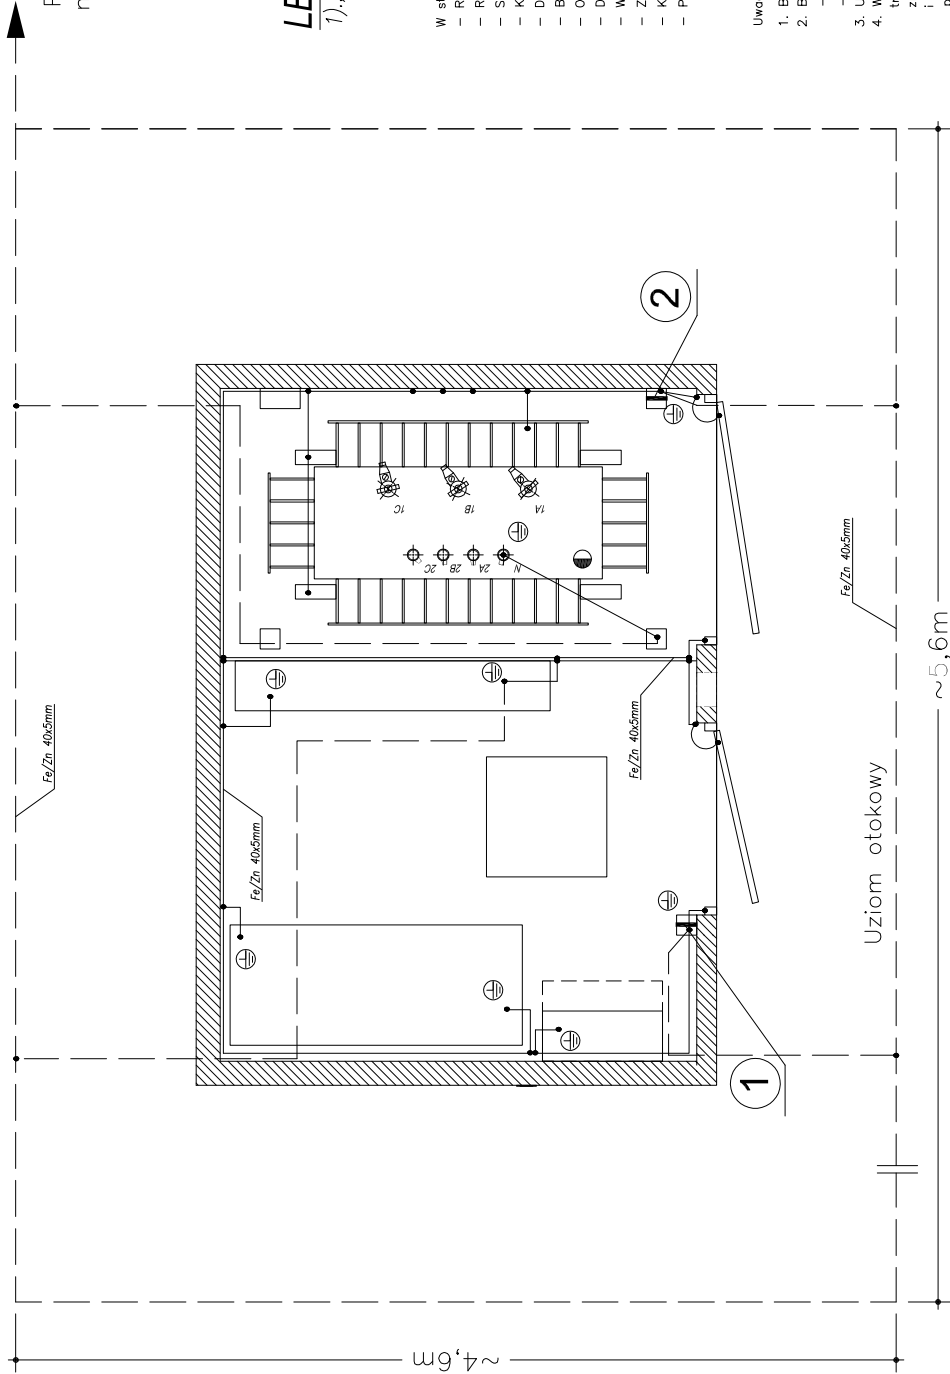

Połączenie z uziomem naturalnym istniejącym

LEGENDA:


1).; 2). złącza kontrolne PE, wyprowadzenie
bednarki Fe/Zn 40x5mm przez fundament;

- W stacji do głównej magistrali podłączono:
- Rozdzielnicę SN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
 - Rozdzielnicę nN w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
 - Szafę telemechaniki w jednym punkcie – przewód LgY 25 mm2;
 - Szafę transformatora – przewód LgY 35 mm2;
 - Dach stacji jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie.
 - Bryła główna, fundament (kablownia) w dwóch punktach – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
 - Ościeżnice w jednym punkcie – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
 - Drzwi w jednym punkcie – przewód LgY 25 mm2;
 - Wóz – jest zabezpieczony przez połączenie z konstrukcją stacji w betonie.
 - Zbrojenie fundamentu w jednym punkcie – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
 - Konstrukcja do połączenia żył powrotnych kabli SN – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];
 - Płyty transformatora – bednarką Fe/Zn 40x5 [mm];

Uwagi:

1. Bednarkę 40x5 mm uziemienia otokowego ułożyć na głębokości 0,8 m.
2. Bednarkę uziemiającą wewnątrz stacji oznaczać:
 - uziemienia robocznego (punktu neutralnego transf.) – kolor niebieski
 - uziemienia ochronnego – kolor żółto – zielony
3. Uziemienie stacji połączyć z istniejącymi uziomami naturalnymi
4. W przypadku zastosowania zacisków izolowanych po stronie m transformatora uziemienie robocze punktu neutralnego należy zrealizować za pomocą przewodu giętkiego o przekroju jak PEN i doprowadzić do kanału kablowego rozdzielni nn a następnie połączyć z oddzielną bednarką uziemiającą połączoną z uziomem otokowym.


Producent:	PGE Dystrybucja S.A.				data: 2021.12	
	Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	Nr uprawnień:	3/Lb/96	Lokalizacja:	xxx
	Opracował:	inż. K. Gajderowicz		–	Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21
	Zatwierdził:	--		–	Tytuł rysunku:	Instalacja uziemiająca stacji
	Adaptował:	--		–		Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6
EI mont					arkusz:	1/1
Lublin Sp. z o.o.					format:	A4
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1					skala:	1:
					rys. nr	E7

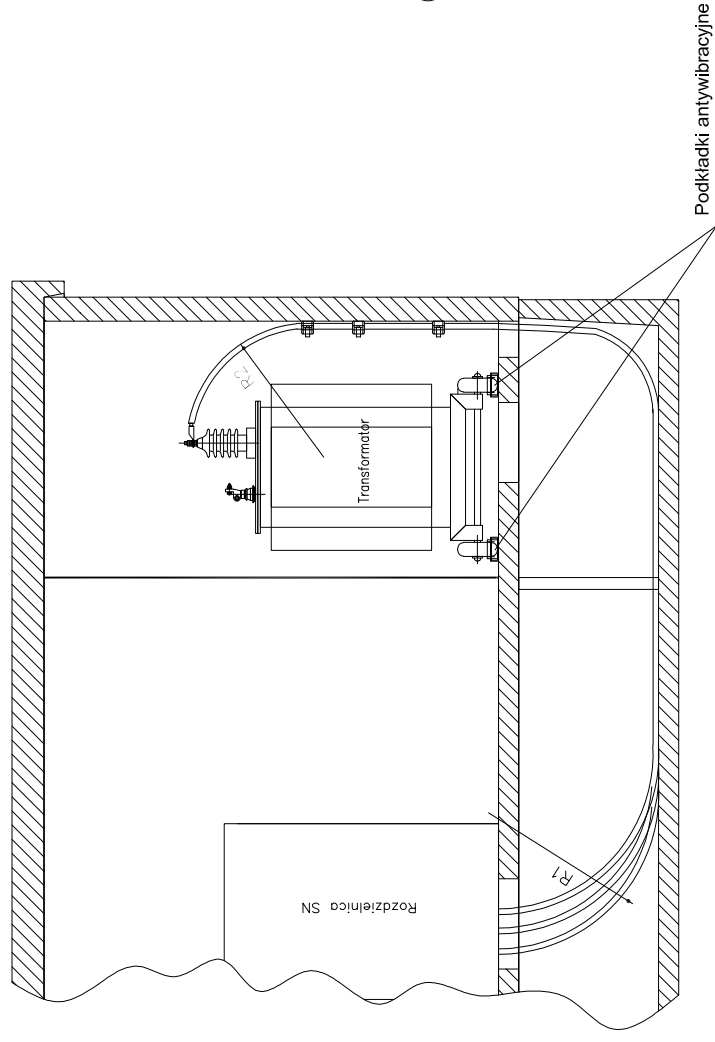

UWAGA !

Dla kabla YHAKXS 1X70mm2 R min.=453mm

Możliwy do uzyskania max promień R1=550mm
R2=650mm

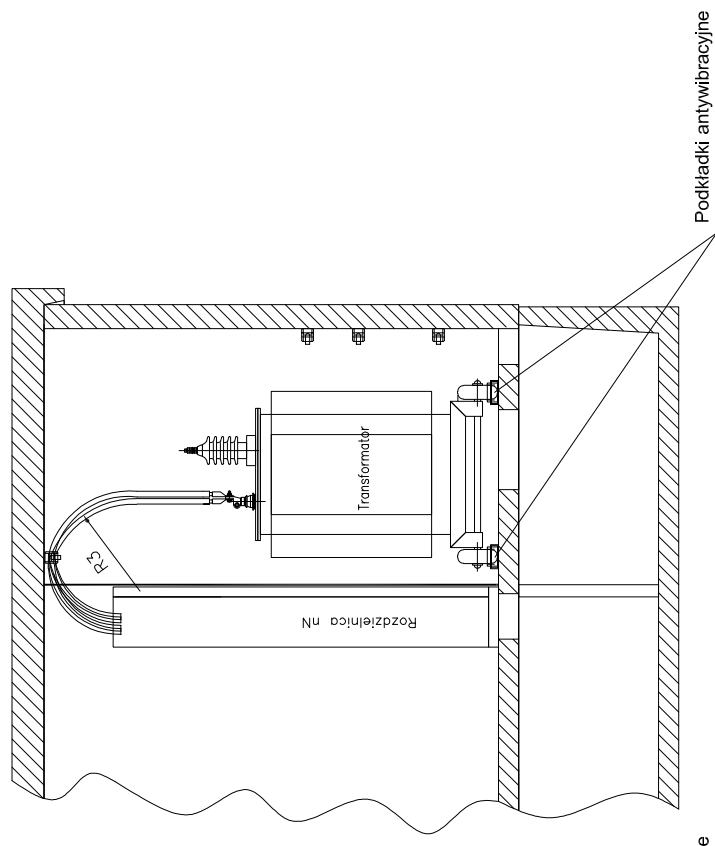

UWAGA !

Dla kabla YKXS 1x240mm2 R3 min.=414 mm.


Producent:




Elektromontaż
Lublin Sp. z o.o.
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	PGE Dystrybucja S.A.	data: 2021.12
Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96		Lokalizacja:	xxx	skala: 1:
Opracował:	inż. K. Gajderowicz	—		Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21	format: A4
Zatwierdził:	—	—		Tytuł rysunku:	Widok podłączenia kabli nN i SN	arkusz: 1/1
Adaptował:	—	—			Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6	rys. nr E8


Wkład uszczelniający typu PKL (prod. Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o.)

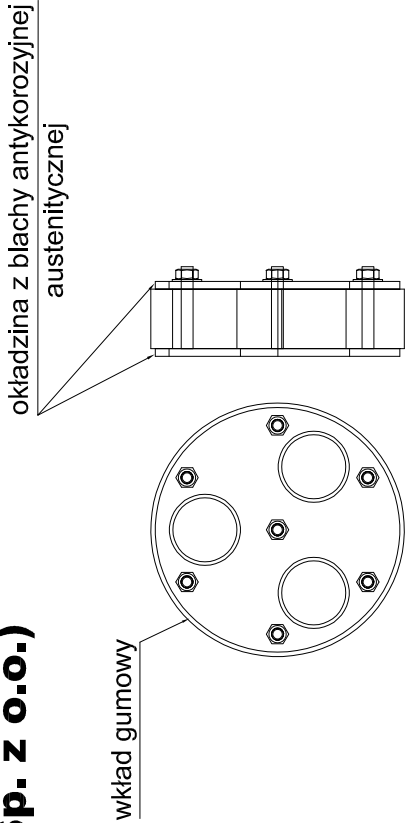

Strona SN - wkład uszczelniający PKL-170-3/.....

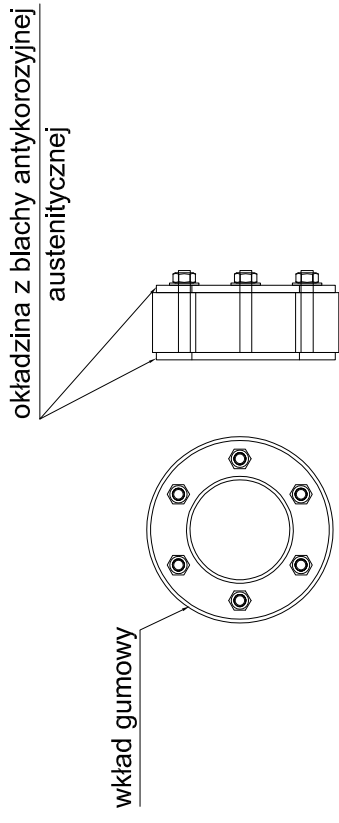

Strona nN - wkład uszczelniający PKL-125-1/.....

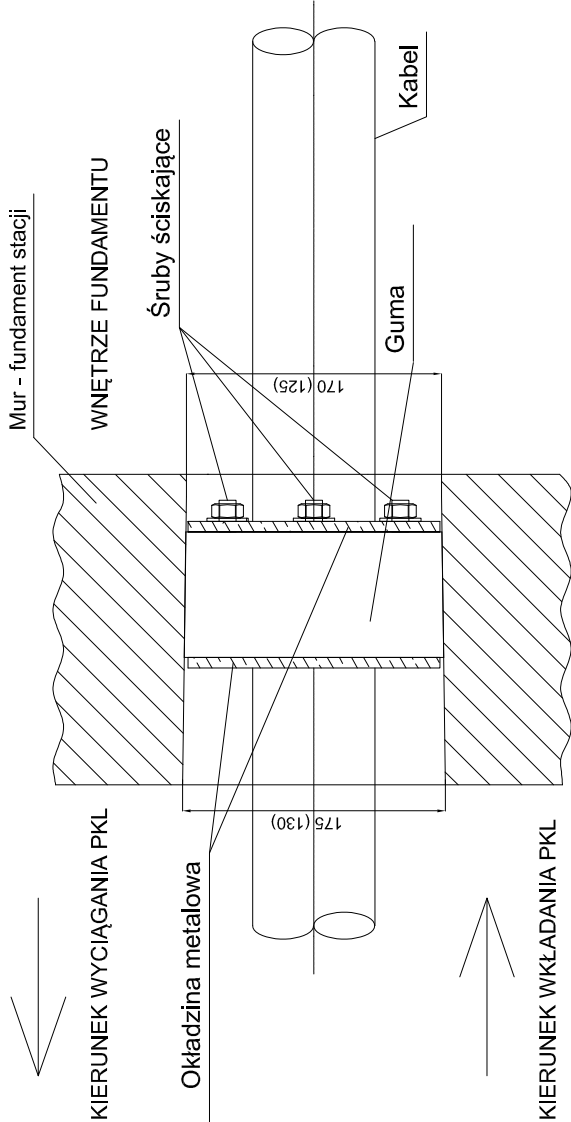

Producent:		Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	PGE Dystrybucja S.A.	data:	2021.12
Projektował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96			Lokalizacja:	xxx	skala:	1:
Opracował:	inż. K. Gajderowicz	—			Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21	format:	A4
Zatwierdził:	—	—			Tytuł rysunku:	Uszczelnienie doprowadzeń kablowych	arkusz:	1/1
Adaptował:	—	—			Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6		rys. nr	E9

WYBÓR STEROWANIA	
0 - sterow. odstawione	1 - sterow. lokalne
2 - sterow. zdalne	

Xirla-xGear - POLE NR 1 (K)

ZASILANIE	PRZELĄCZNIK WYBORU STEROWANIA
-----------	-------------------------------------

SYGNAŁ DO TELEMECH.		
PRZELĄCZNIK 1P - POZYCJA		
1	2	0 WSPÓLNY


SYGNAŁ. OPTYCZNA GOTOWOŚĆ DO STER. ELEKTRYCZNEGO ZIELONA LAMPKA	SYGNAŁ. DO TELEM. GOTOWOŚĆ DO STER. ELEKTRYCZNEGO
--	---

STEROWANIE	
ZAMKNIJ LOKALNIE Przycisk na elew.	ZAMKNIJ ZDALNIE Z Z -STEROWNIK Z O -STEROWNIK

SYGNAL, DO TELEMECH.			
ROZŁĄCZNIK		ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIKI	
OTWARTY	ZAMKNIĘTY	OTWARTY (bez pracy)	ZAMKNIĘTY (bez prądu)

4G10-...-U-R014

POLE NR 1

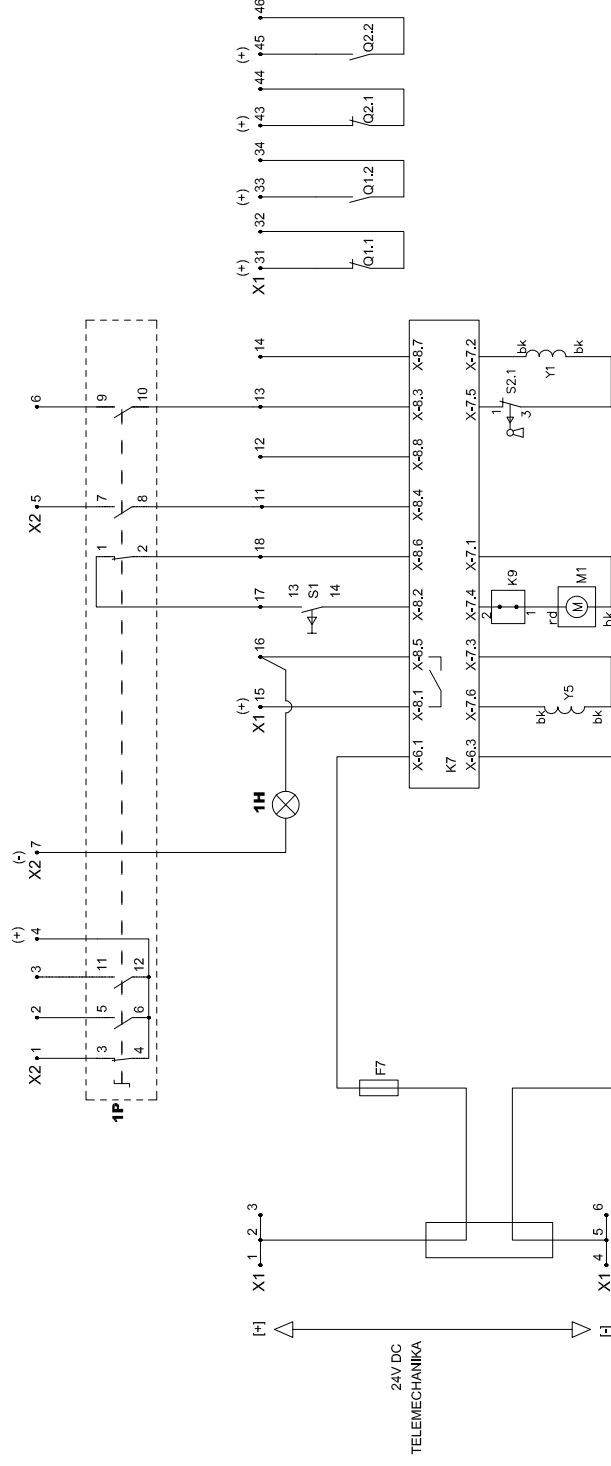

Uwaga : Łącznik krzykowy 1P, lampkę zieloną 1H, zaciski X1-17, 18 oraz listwę X2 dobudować w polu Xirla-xGear

Producent:



Elektromontaż

Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Producent:							PGE Dystrybucja S.A.		data: 2021.12
							Lokalizacja: xxx		skala: 1:
	Projekował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96				Numer oprac.: PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKKT/12/21		format: A4
	Opracował:	inż. K. Gajderowicz	—				Tytuł rysunku: Obwody wtórne rozdzielnicy SN. Pole 1. Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3.6		arkusz: 1/1
	Zatwierdził:	—	—						rys. nr E10
	Adaptował:	—	—						

WYBÓR STEROWANIA

0 - sterow. odstawione
1 - sterow. lokalne
2 - sterow. zdalne

XIrla-xGear - POLE NR 2 (K)

ZASILANIE	PRZELĄCZNIK WYBORU STEROWANIA
-----------	-------------------------------------

SYGNAŁ DO TELEMECH.		
PRZELĄCZNIK 2P - POZYCJA		
1	2	0 WSPÓLNY


SYGNAŁ. OPTYCZNA GOTOWOŚĆ DO STER. ELEKTRYCZNEGO ZIELONA LAMPKA	SYGNAŁ. DO TELEM. GOTOWOŚĆ DO STER. ELEKTRYCZNEGO
--	---

	STEROWANIE	
ZAMKNIJ LOKALNIE Przewisk na elew.	ZAMKNIJ ZDALNIE	OTWÓRZ ZDALNIE Z O-STEROWNIKI Z Z-STEROWNIKI

SYGNAL DO TELEMECH.			
ROZŁĄCZNIK		ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIKI	
OTWARTY	ZAMKNIĘTY	OTWARTY (bez pracy)	ZAMKNIĘTY (bez prądu)

4G10-...-U-R014

POLE NR 2

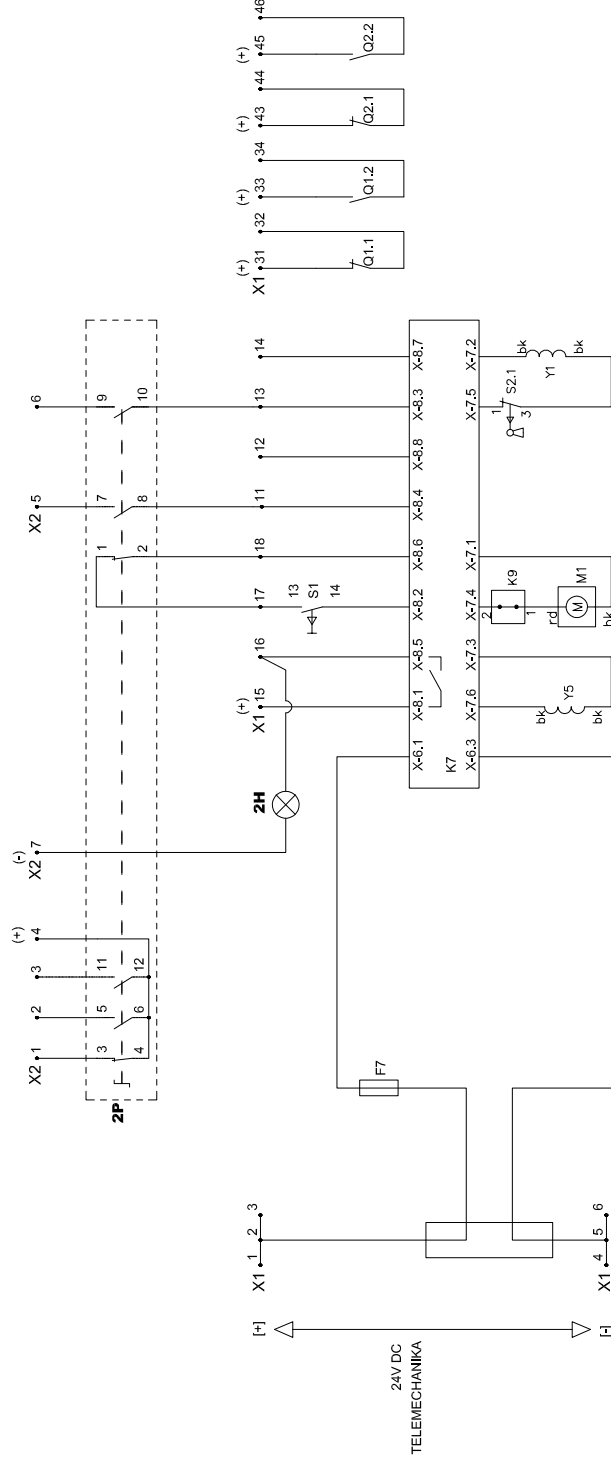

Uwaga : Łącznik krzykowy 2P, lampkę zieloną 2H, zaciski X1-17, 18 oraz listwę X2 dobudować w polu Xirla-xGear

Producent:



Elektromontaż

Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

[illegible]

WYBÓR STEROWANIA
0 - sterow. odstawione
1 - sterow. lokalne
2 - sterow. zdalne

XIrla-xGear - POLE NR 3 (K)

ZASILANIE	PRZELĄCZNIK WYBORU STEROWANIA
-----------	-------------------------------------

SYGNAŁ DO TELEMECH.		
PRZELĄCZNIK 3P - POZYCJA		
1	2	0 WSPÓLNY


SYGNAŁ. OPTYCZNA GOTOWOŚĆ DO STER. ELEKTRYCZNEGO ZIELONA LAMPKA	SYGNAŁ. DO TELEM. GOTOWOŚĆ DO STER. ELEKTRYCZNEGO
--	---

	STEROWANIE	
ZAMKNIJ LOKALNIE Przewieś na elew.	ZAMKNIJ ZDALNIE	OTWÓRZ ZDALNIE Z O-STEROWNIKI Z Z-STEROWNIKI

SYGNAL, DO TELEMECH.			
ROZŁĄCZNIK		ODŁĄCZNIKO-UZIEMNIKI	
OTWARTY	ZAMKNIĘTY	OTWARTY (bez pracy)	ZAMKNIĘTY (bez prądu)

4G10-...-U-R014

POLE NR 3

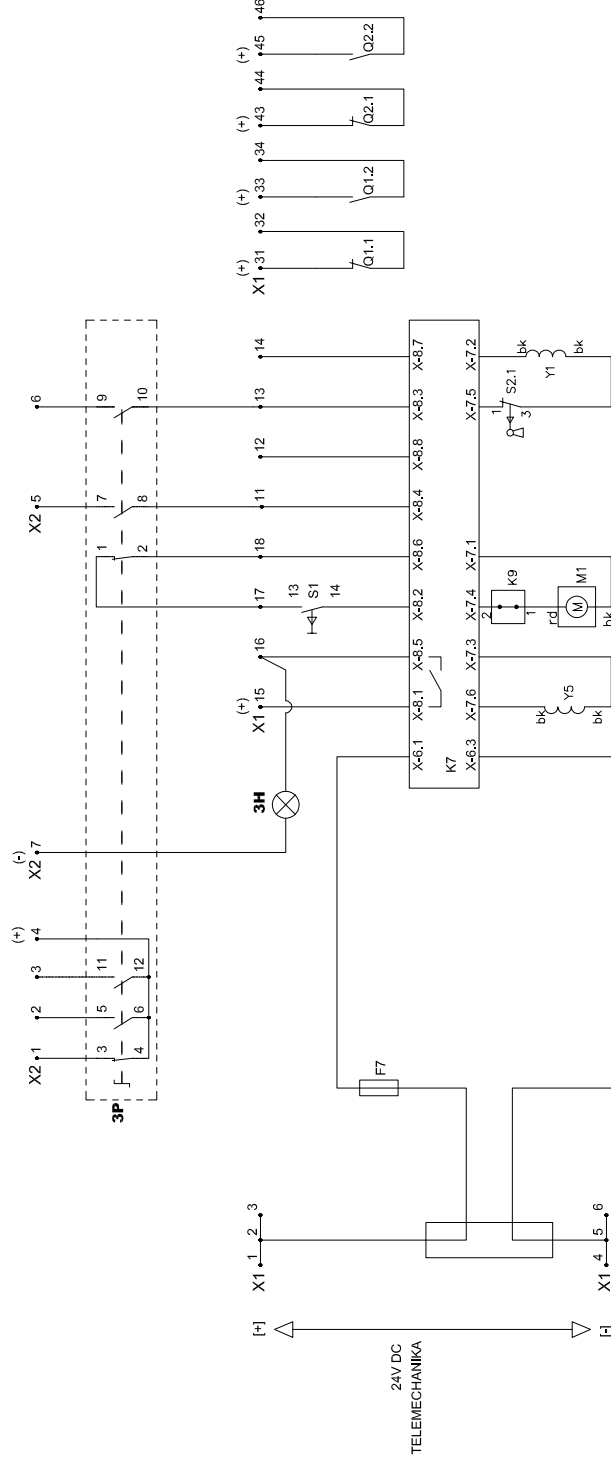

Uwaga : Łącznik krzywkowy 3P, lampkę zieloną 3H, zaciski X1-17, 18 oraz listwę X2 dobudować w polu Xirla-xGear


Producent:



Elektromontaż

Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

Producent:	 Elektromontaż Lublin Sp. z o.o. 20-447 Lublin, ul. Dąbentowa 1	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Inwestor:	PGE Dystrybucja S.A.	data:	2021.12
		Projekował:	mgr inż. Z. Czopik	3/Lb/96	Lokalizacja:	xxx	skala:	1:
		Opracował:	inż. K. Gajderowicz	—	Numer oprac.:	PA/STLmb-3,6/PGE/Zamość/xxx/KKKT/12/21	format:	A4
		Zatwierdził:	—	—	Tytuł rysunku:	Obwody wtórne rozdzielnicy SN. Pole 3.	arkusz:	1/1
		Adaptował:	—	—	Projekt adaptacyjny stacji transformatorowej typu STLmb-3,6			

WYBÓR STEROWANIA
0 - sterow. odstawione
1 - sterow. lokalne
2 - sterow. zdalne

Xirla-xGear - POLE NR 4 (T)

ZASILANIE	PRZELĄCZNIK WYBORU STEROWANIA
-----------	-------------------------------------


SYGNAŁ. DO TELEMECH.			
PRZELĄCZNIK 4P - POZYCJA			
1	2	0	WSPÓLNY

SYGNAŁ. OPTYCZNA GOTOWOŚĆ DO STER. ELEKTRYCZNEGO ZIELONA LAMPKA	SYGNAŁ. DO TELEM. GOTOWOŚĆ DO STER. ELEKTRYCZNEGO
--	---

	STEROWANIE		OTWÓRZ ZDALNIE
ZAMKNIJ LOKALNIE Przycisk na elew.	ZAMKNIJ ZDALNIE	Z.Z.-STEROWNIK	Z.O.-STEROWNIK

SYGNAŁ DO TELEMECH.			
WYŁĄCZNIK	ODŁĄCZNIKO-UZIEMIENIK		STYK POM. WSKAZNIK ZADZIAŁANIA ZABEZP. AUT.
OTWARTY	ZAMKNIĘTY	OTWARTY (poz. pracy)	ZAMKNIĘTY (poz. uziem.)

4G10-...-U-R014

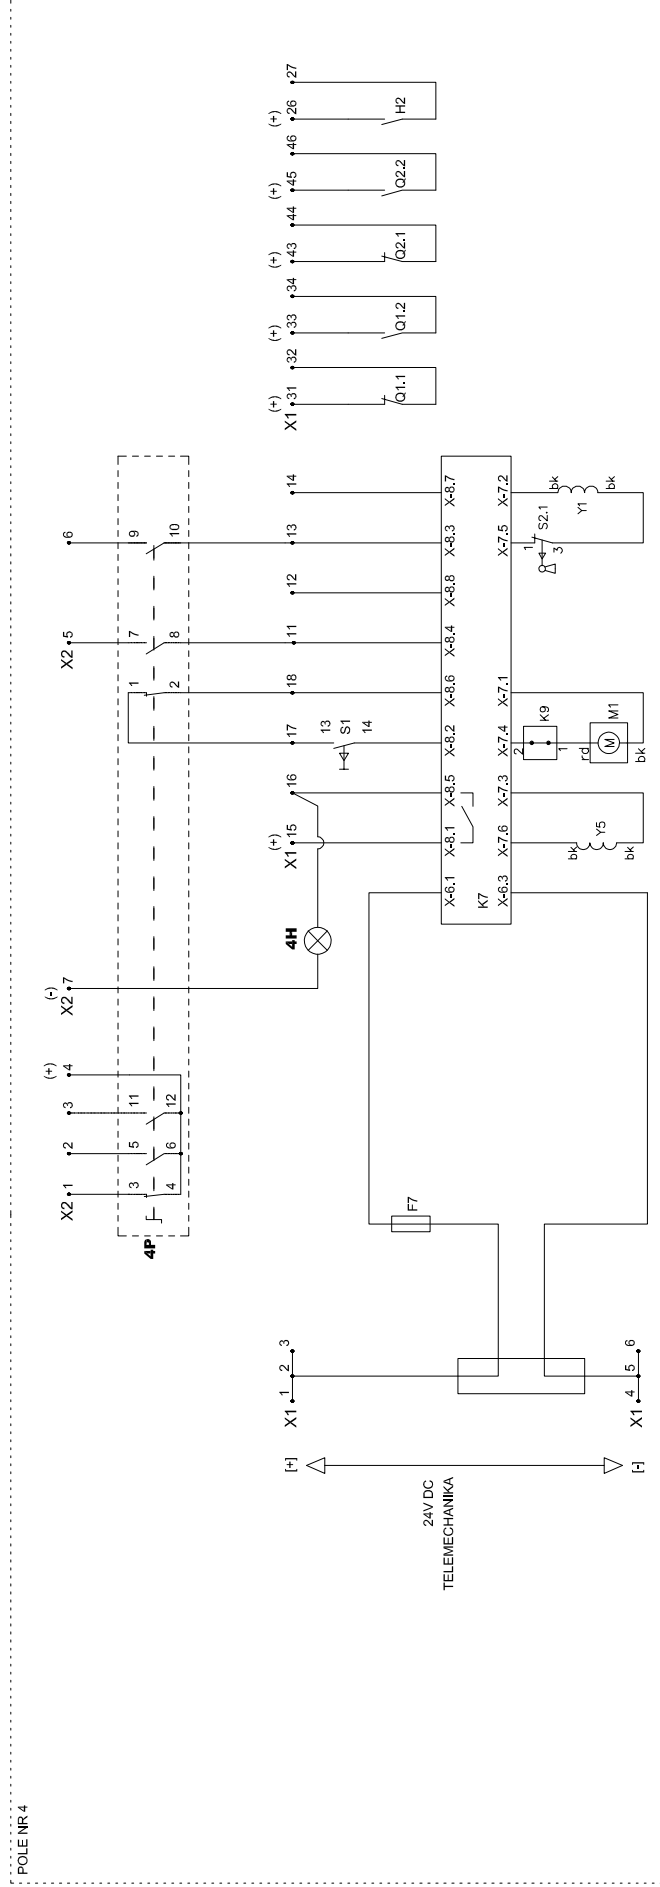

Uwaga : Łącznik krzywkowy 4P, lampkę zieloną 4H, zaciski X1-17, 18 oraz Ilistwę X2 dobudować w polu Xirla-xGear

Producent:



Elektromontaż

Lublin Sp. z o.o.

20-447 Lublin, ul. Diamentowa 1

[illegible]
